

Foreløbig udgave 25.03.2020



SNC • LAVALIN

ATKINS

Member of the SNC-Lavalin Group


Bro 20995 Hvidemøllevej

Anlægslogistik og trafikafvikling

Foreløbig udgave

Fase 1a

Ca. 82 p-pladser er ikke tilgængelig

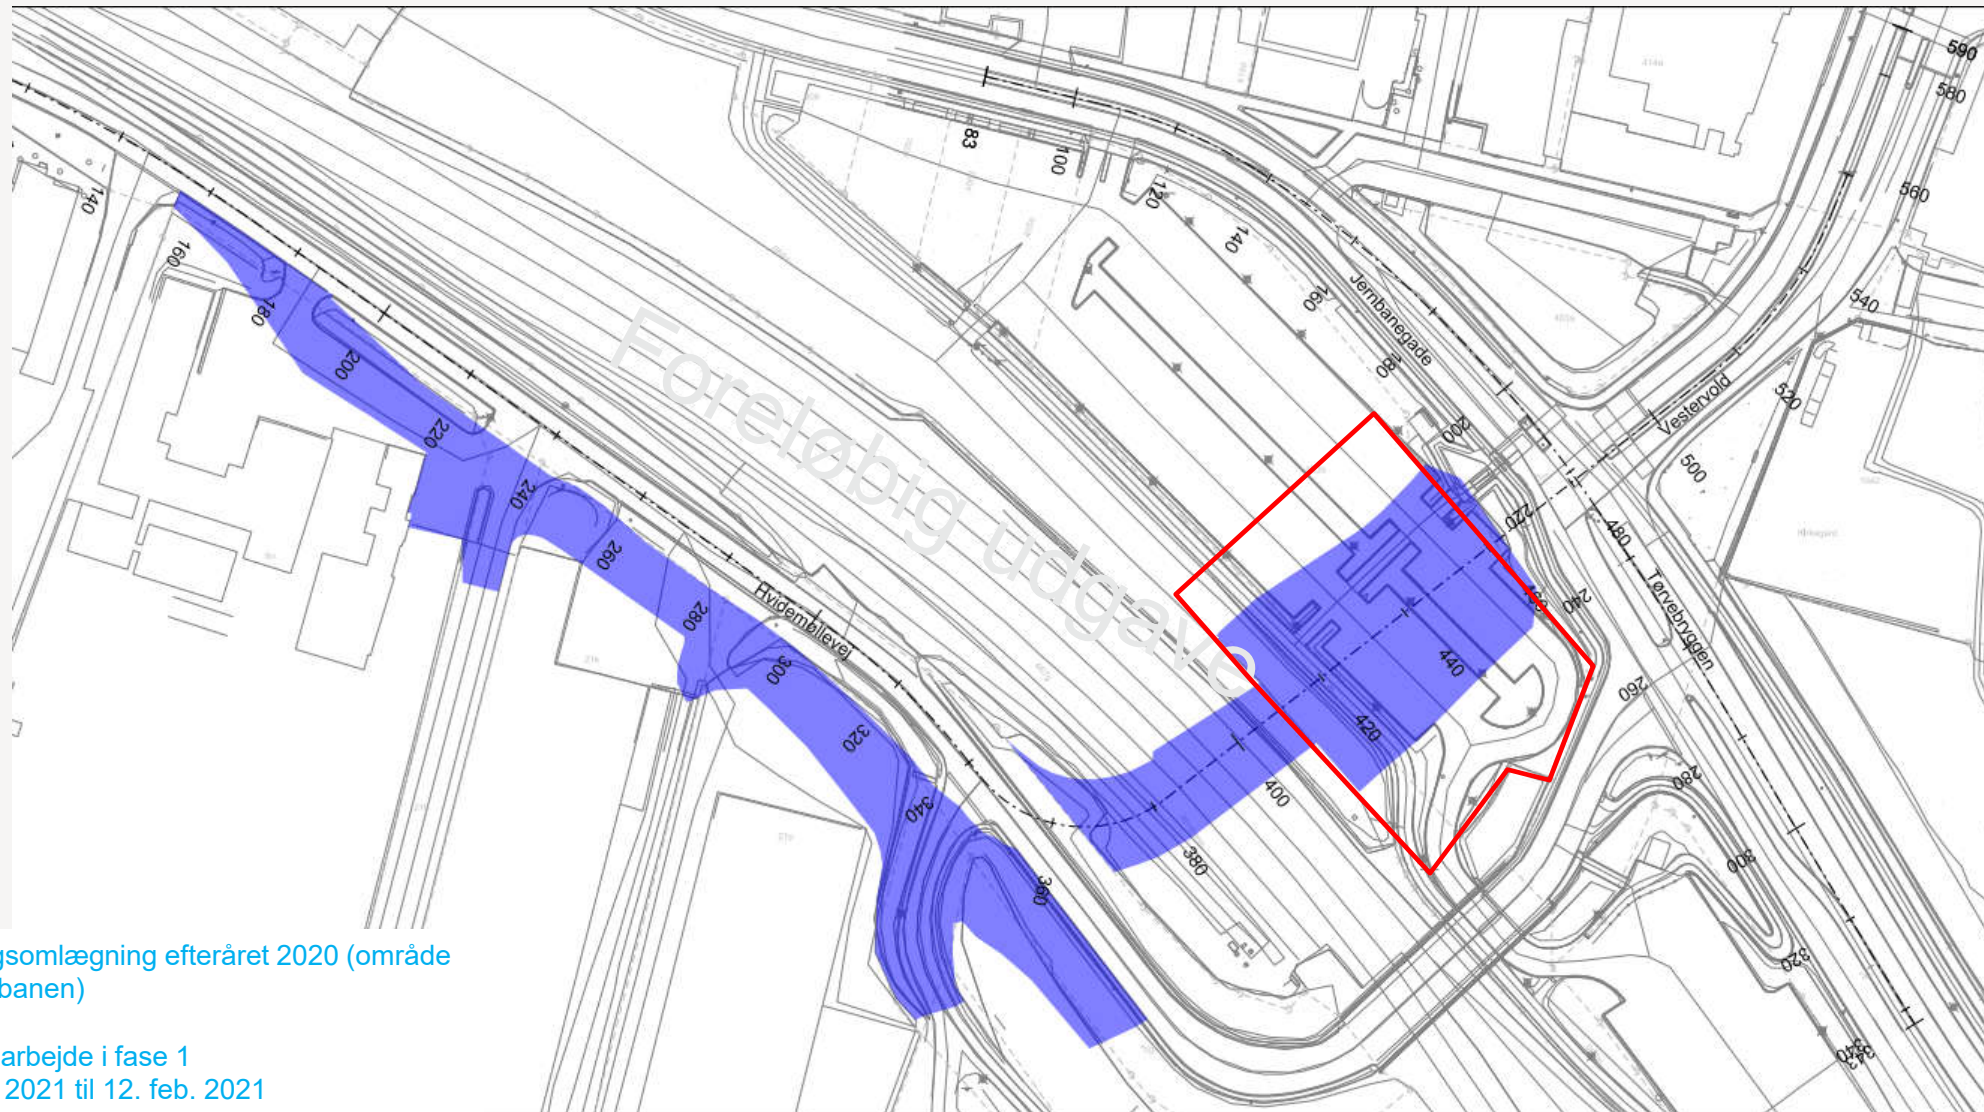


Ledningsomlægning efteråret 2020 (område syd for banen)

Anlægsarbejde i fase 1
04. jan. 2021 til 12. feb. 2021

Fase 1b

Ca. 82 p-pladser er ikke tilgængelig

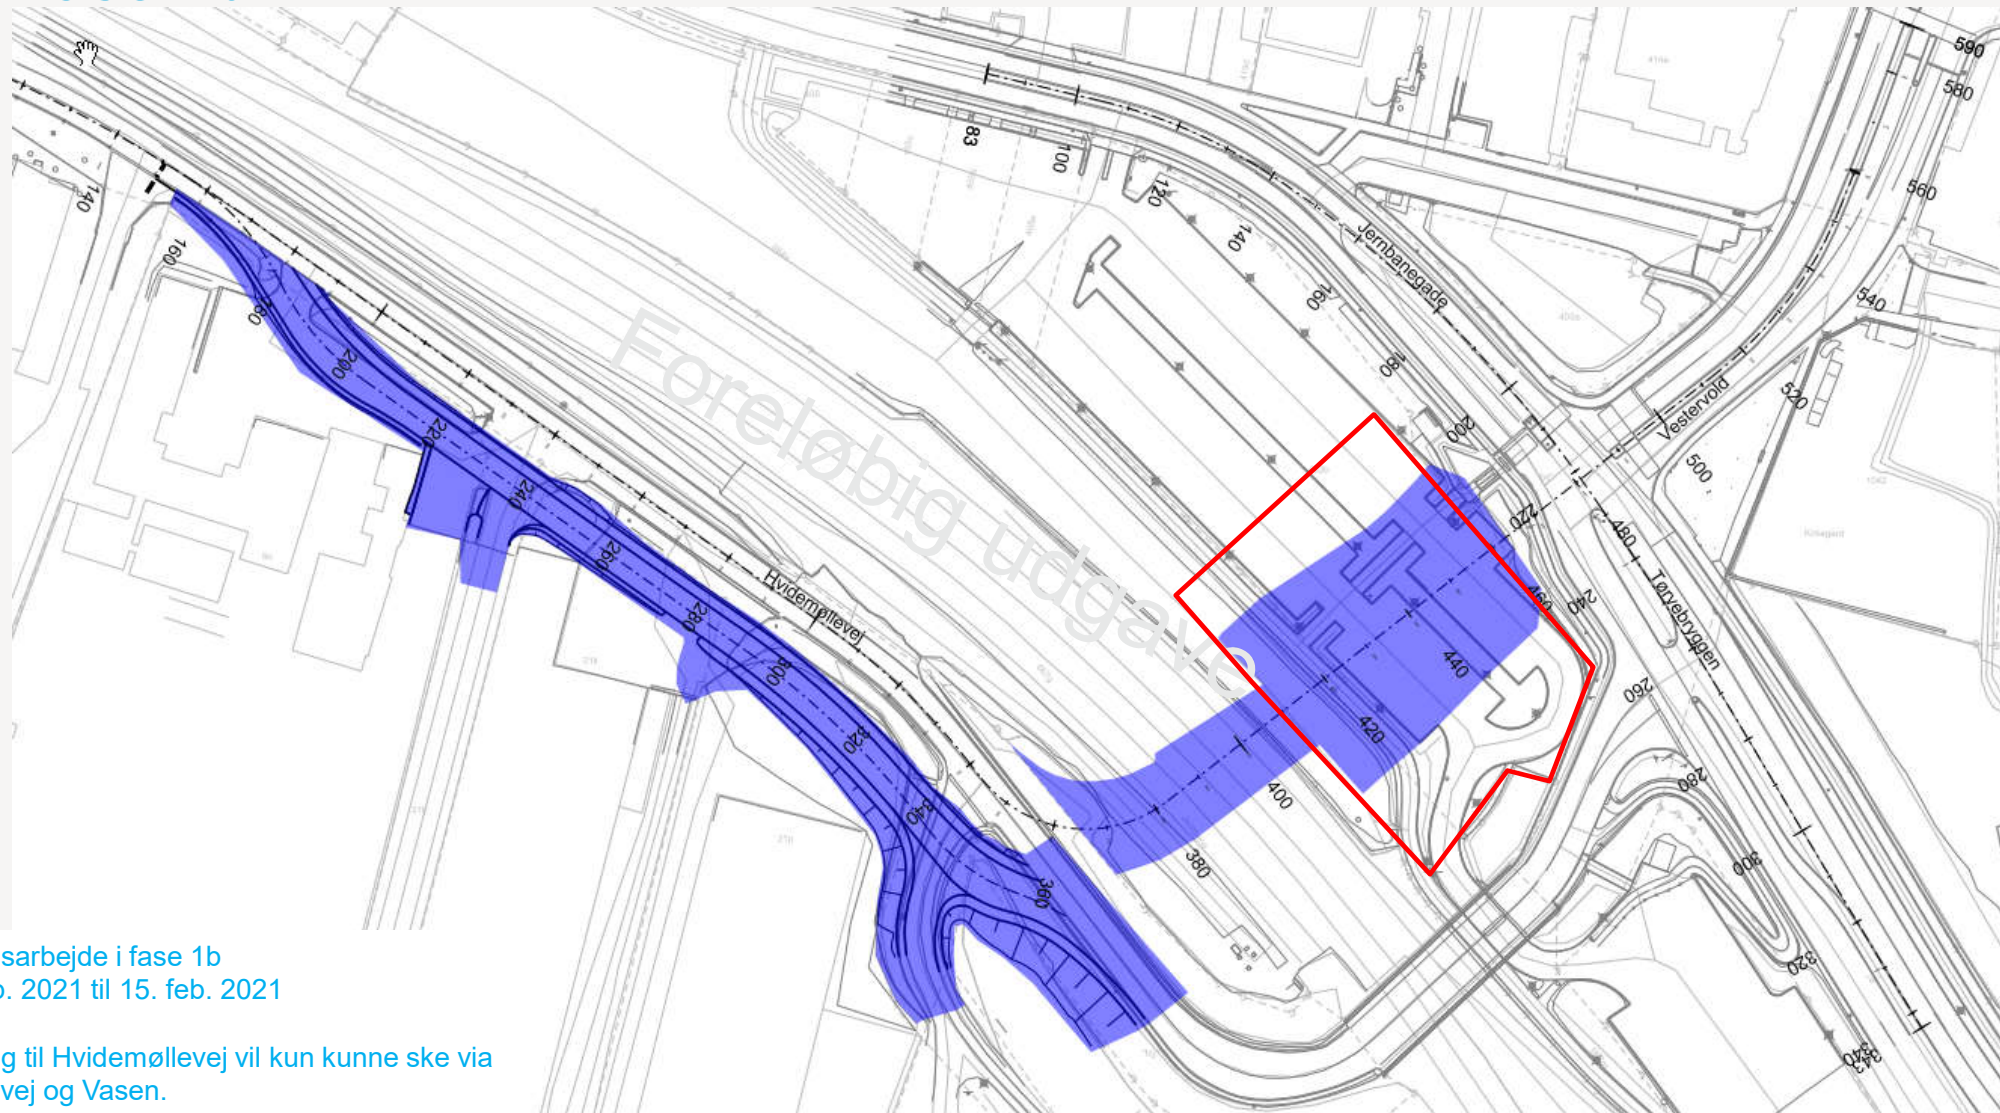


Anlægsarbejde i fase 1b
12. feb. 2021 til 15. feb. 2021

Adgang til Hvidemøllevej vil kun kunne ske via
Viborgvej og Vasen.

Fase 2

Ca. 118 p-pladser er ikke tilgængelig

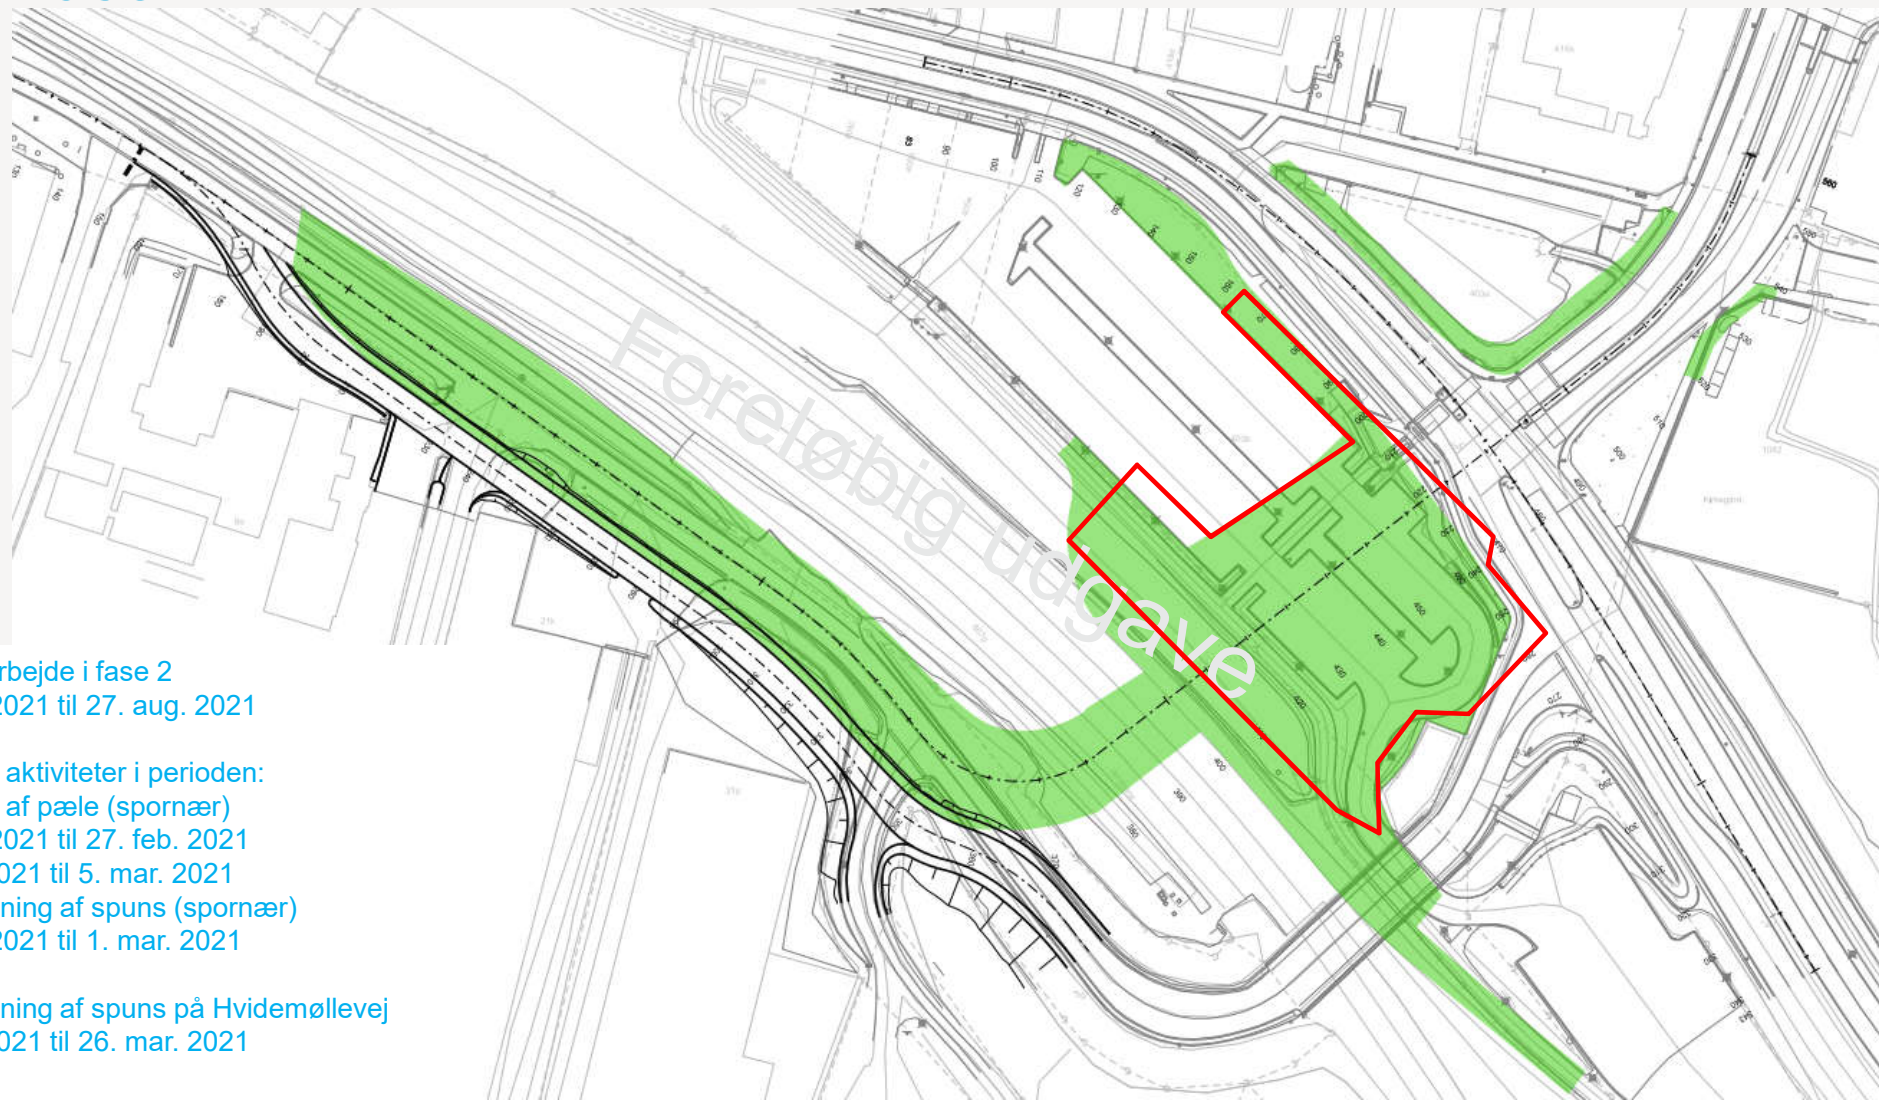


Anlægsarbejde i fase 2
15. feb. 2021 til 27. aug. 2021

Støjende aktiviteter i perioden:
Ramning af pæle (spornær)
24. feb. 2021 til 27. feb. 2021
2. mar. 2021 til 5. mar. 2021
Nedbringning af spuns (spornær)
28. feb. 2021 til 1. mar. 2021

Nedbringning af spuns på Hvidemøllevej
8. mar. 2021 til 26. mar. 2021

Fase 3

Ca. 118 p-pladser er ikke tilgængelig

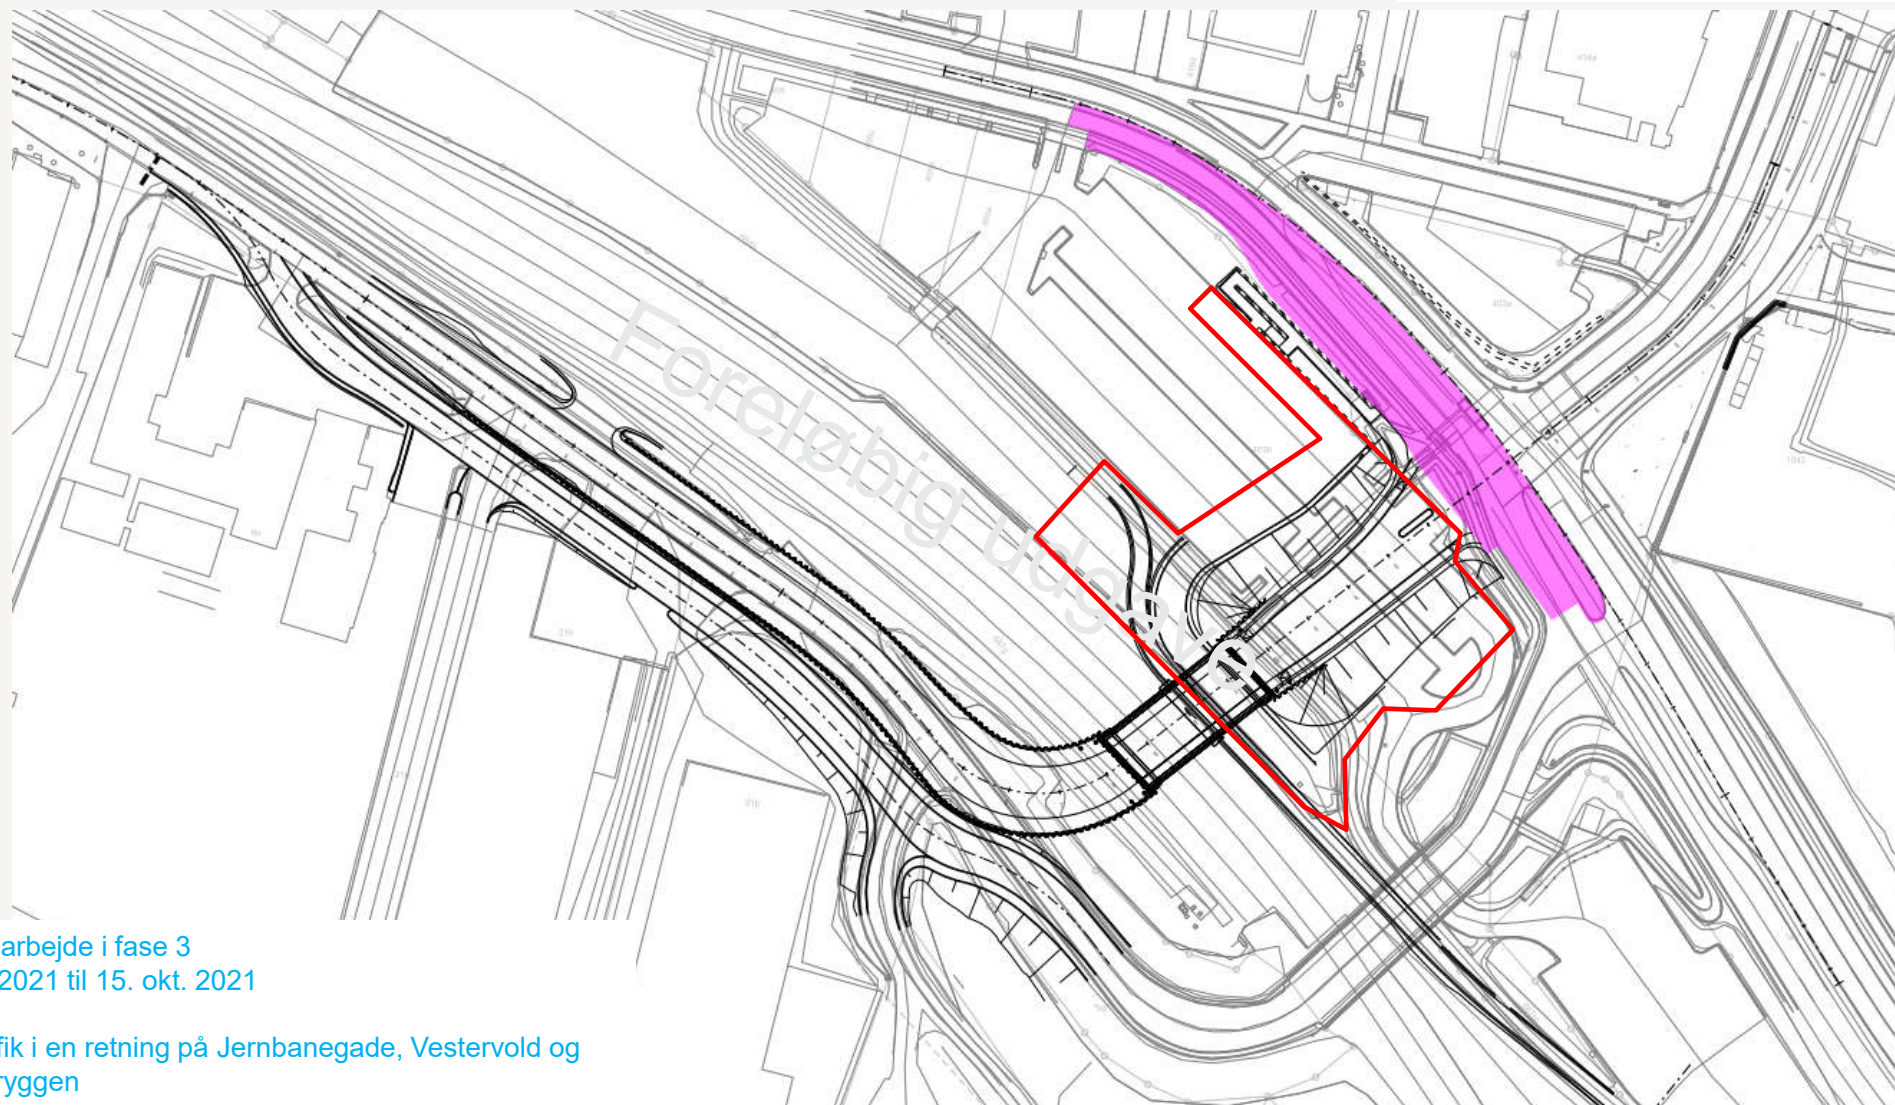


Anlægsarbejde i fase 3
4. sep. 2021 til 15. okt. 2021

Kun trafik i en retning på Jernbanegade, Vestervold og
Tørvebyggen

Fase 4

Ca. 118 p-pladser er ikke tilgængelig

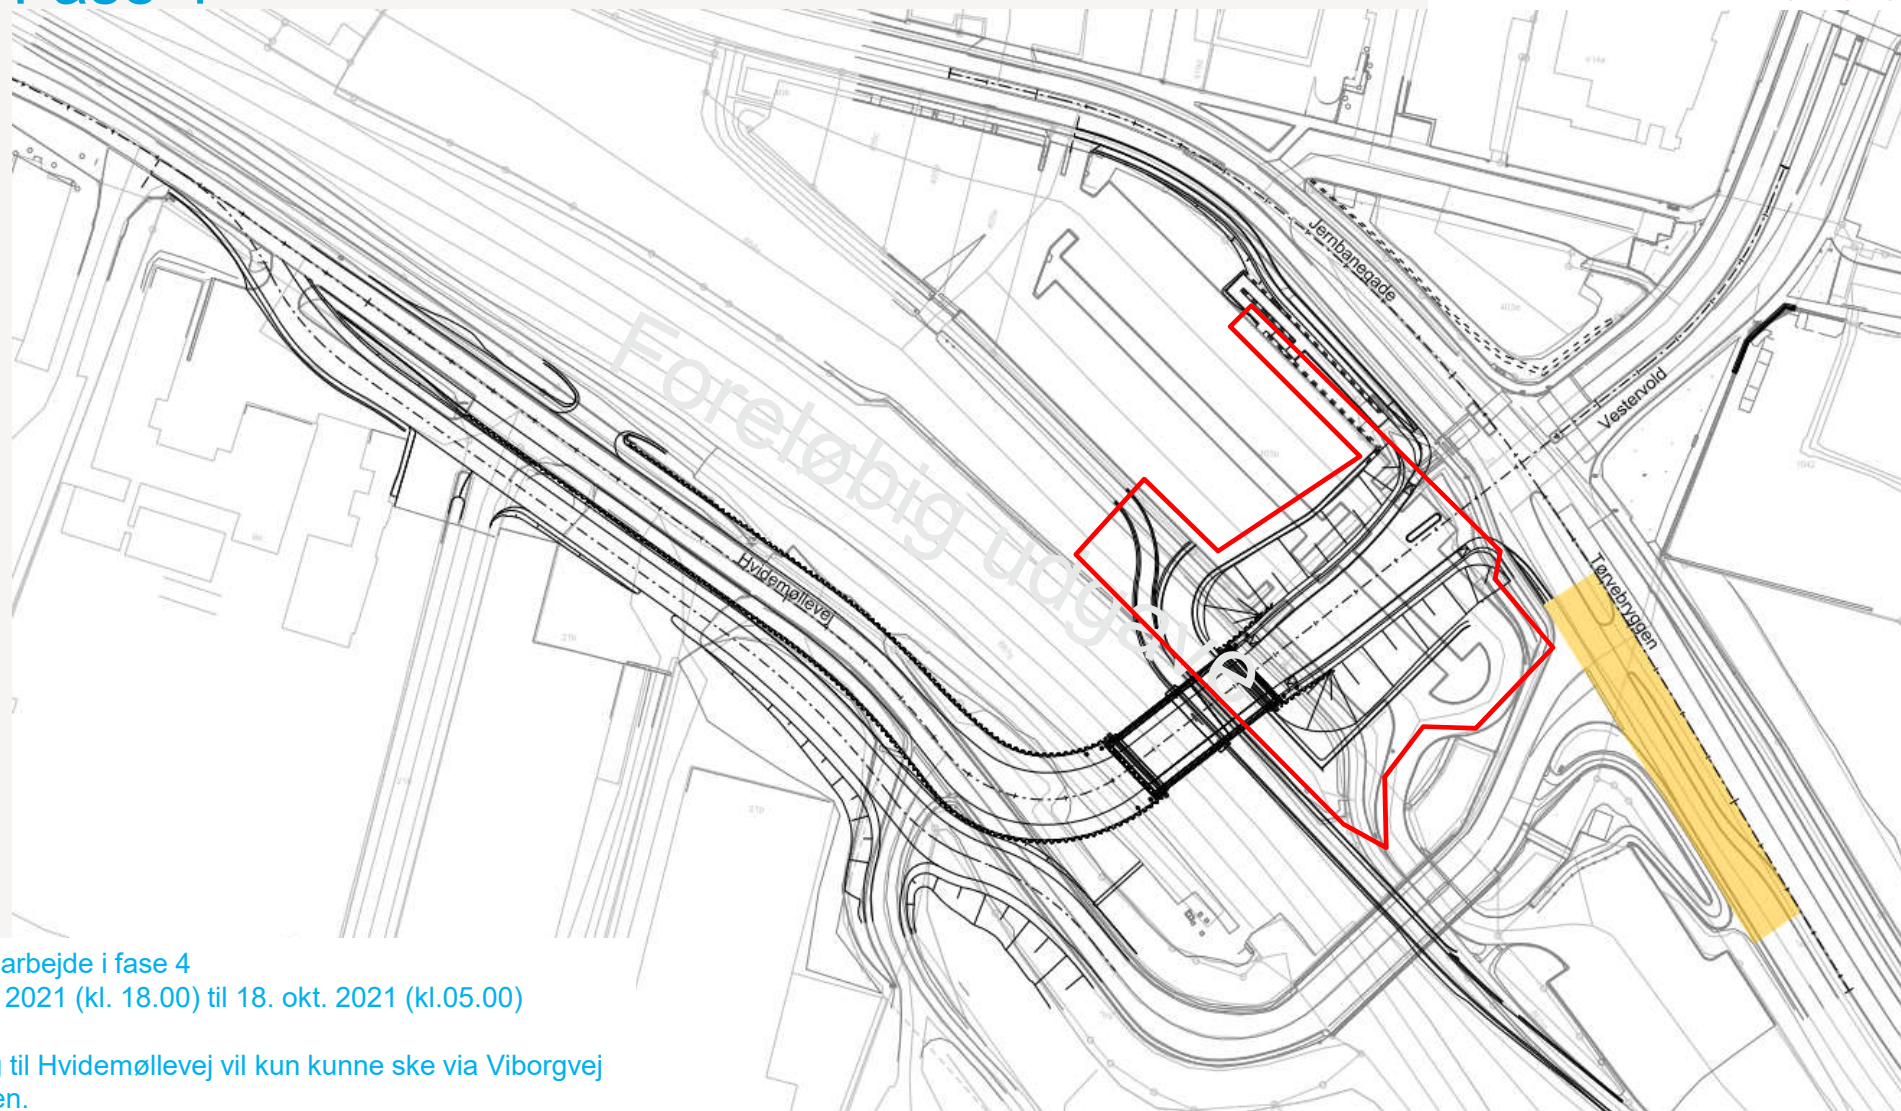


Anlægsarbejde i fase 4
15. okt. 2021 (kl. 18.00) til 18. okt. 2021 (kl.05.00)

Adgang til Hvidemøllevej vil kun kunne ske via Viborgvej
og Vasen.

Fase 5

Ca. 118 p-pladser er ikke tilgængelig i hverdage
Ca. 170 p-pladser er ikke tilgængelig i weekenden

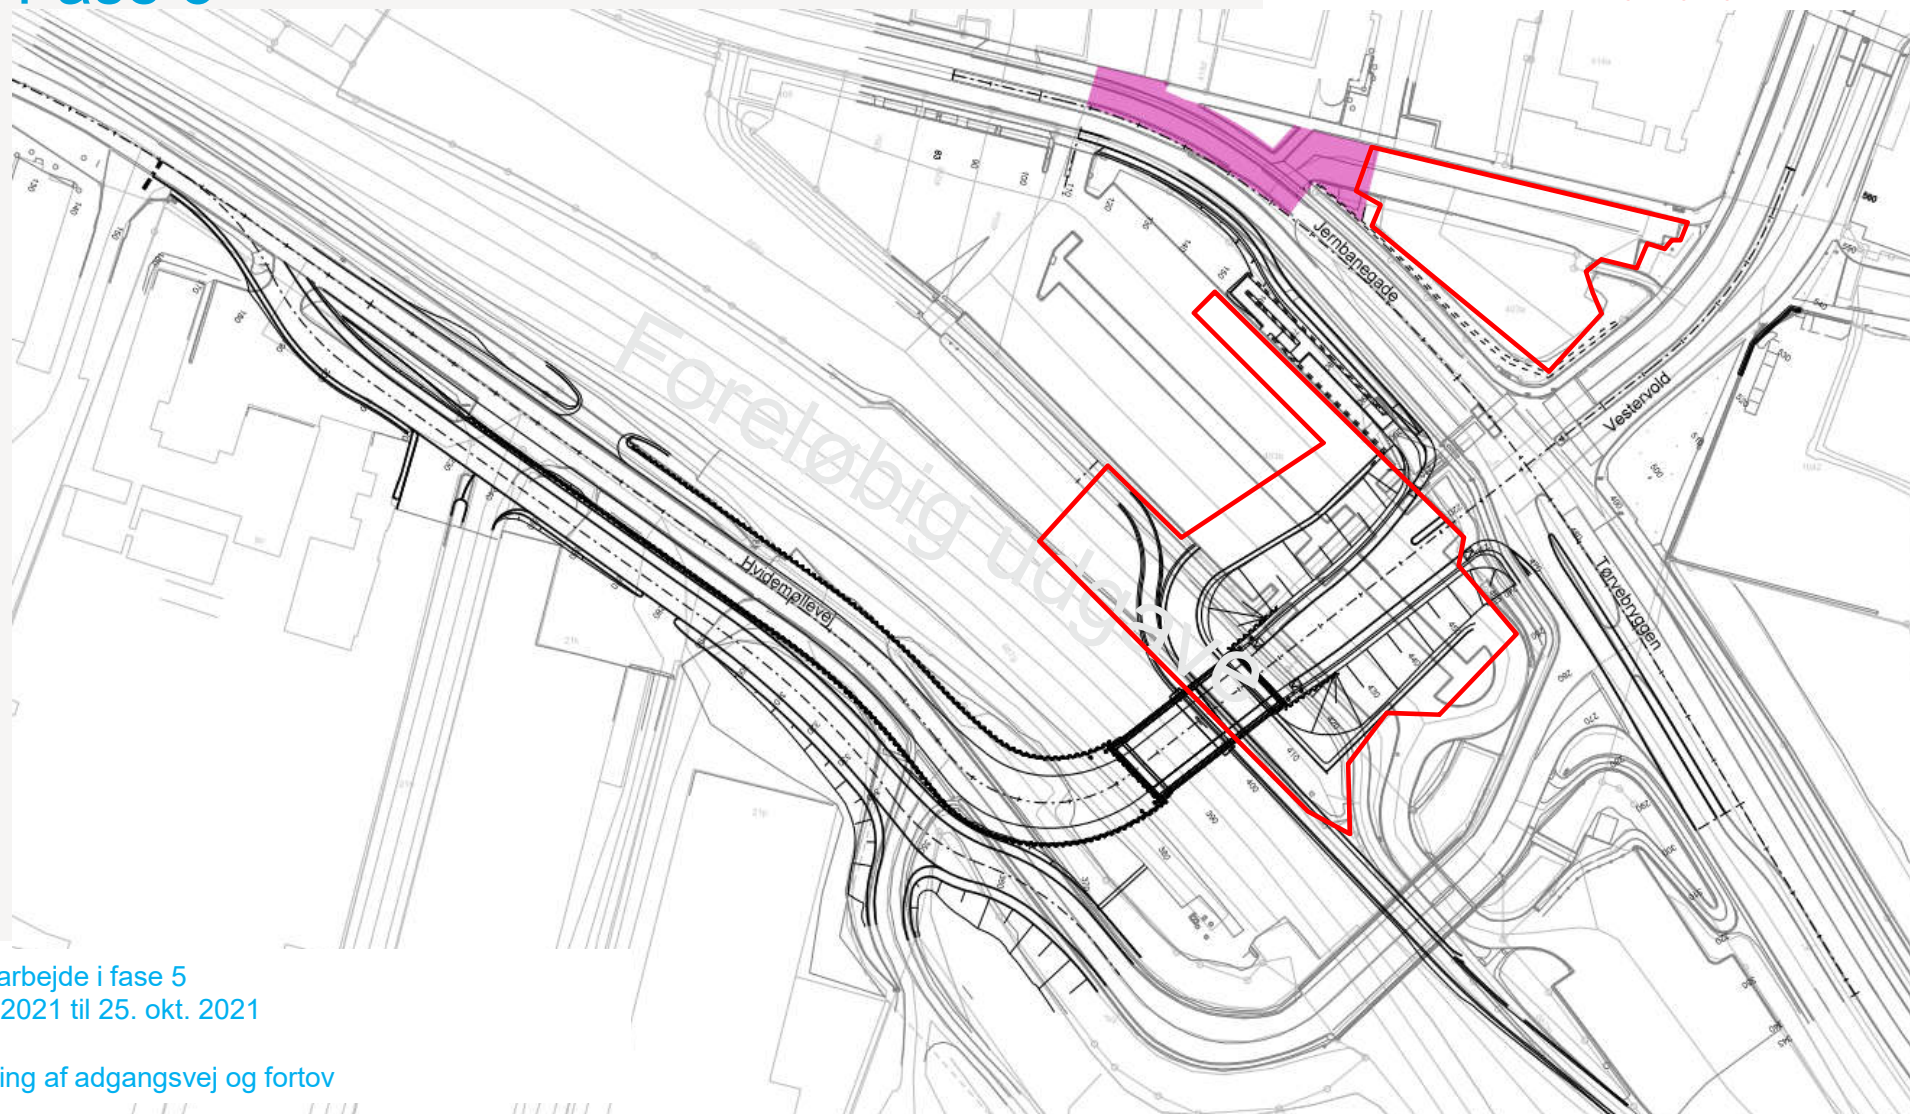


Anlægsarbejde i fase 5
19. okt. 2021 til 25. okt. 2021

Regulering af adgangsvej og fortov

Fase 6

Ca. 111 p-pladser er ikke tilgængelig

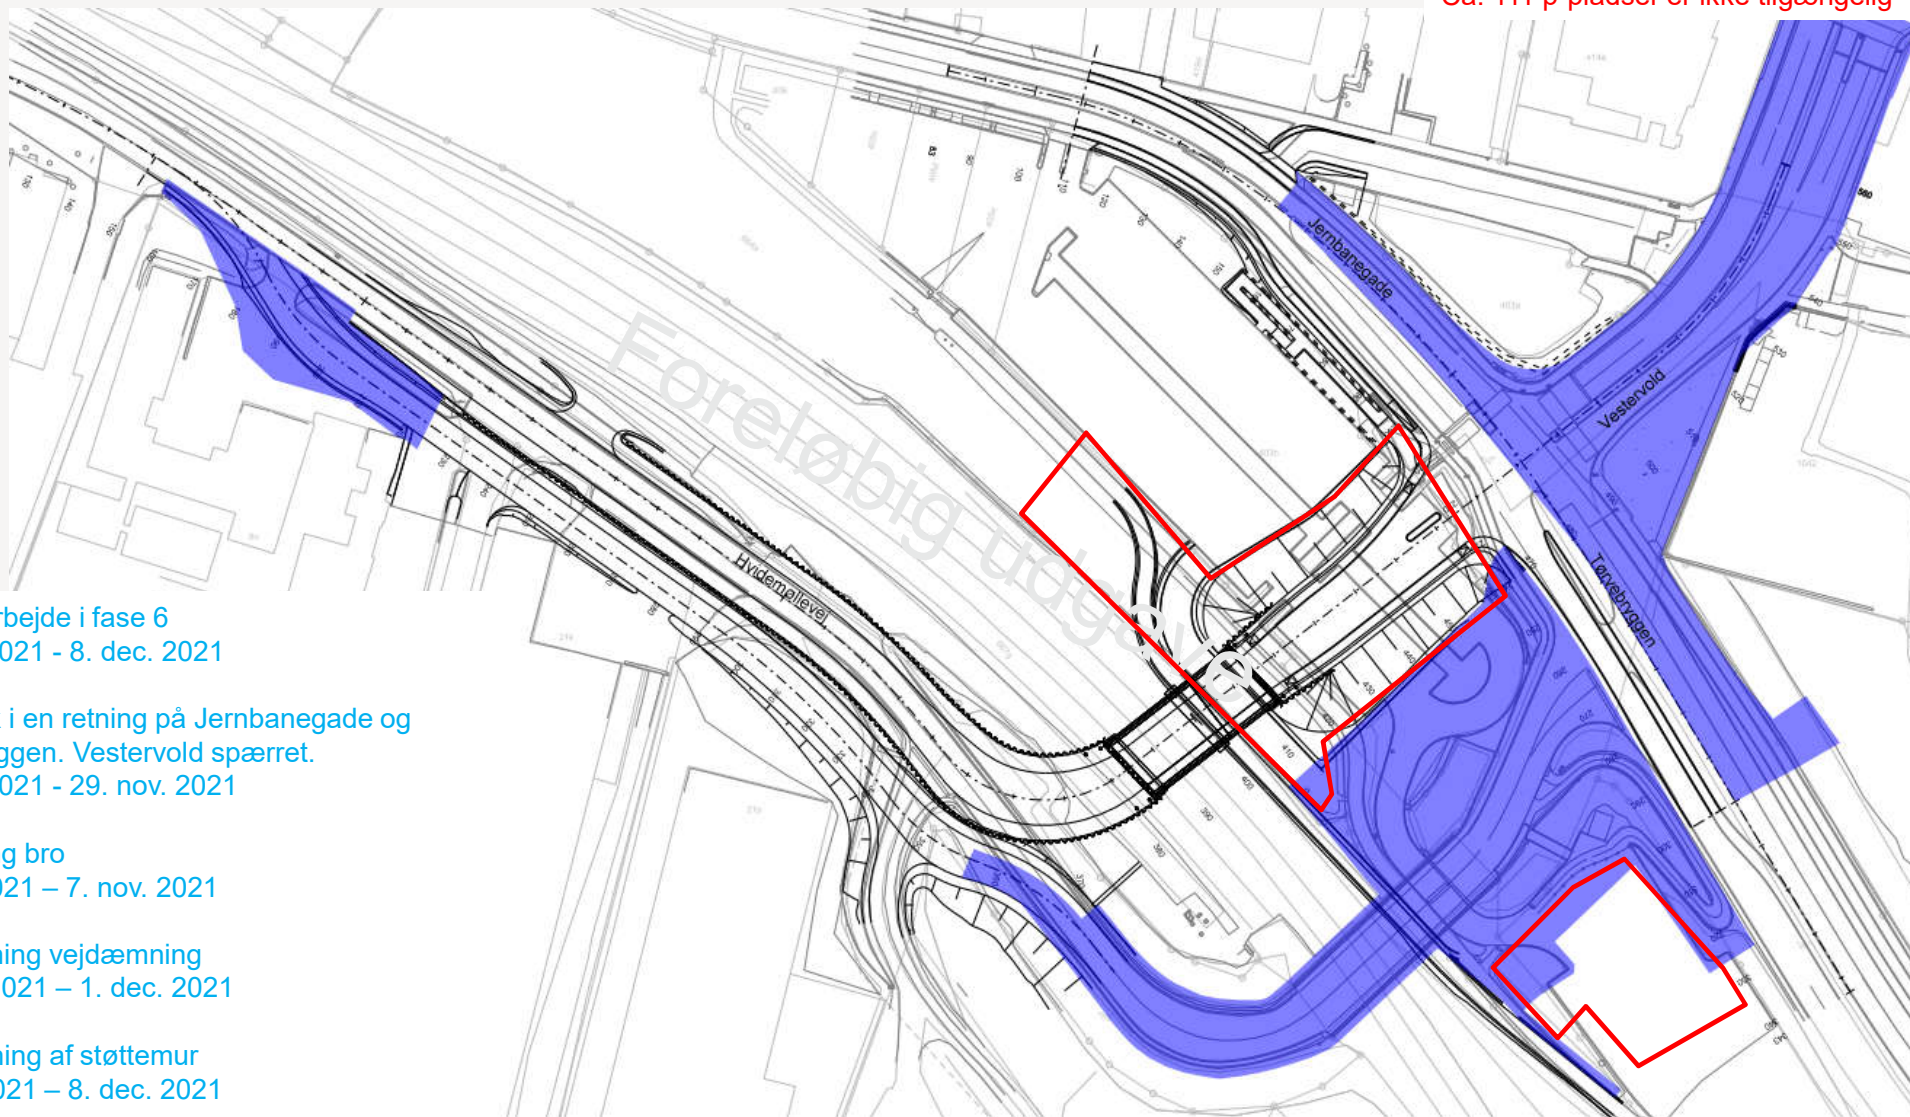

Anlægsarbejde i fase 6
19. okt. 2021 - 8. dec. 2021

Kun trafik i en retning på Jernbanegade og
Tørvebryggen. Vestervold spærret.
19. okt. 2021 - 29. nov. 2021


Nedrivning bro
6. nov. 2021 - 7. nov. 2021

Bortgravning vejdæmning
11. nov. 2021 - 1. dec. 2021

Nedbrydning af støttemur
2. dec. 2021 - 8. dec. 2021

Fase 7

Ca. 100 p-pladser er ikke tilgængelig i hele fasen
Ca. 60 – 100 p-pladser er ikke tilgængelig
(I forbindelse med udlægning af slidlag)

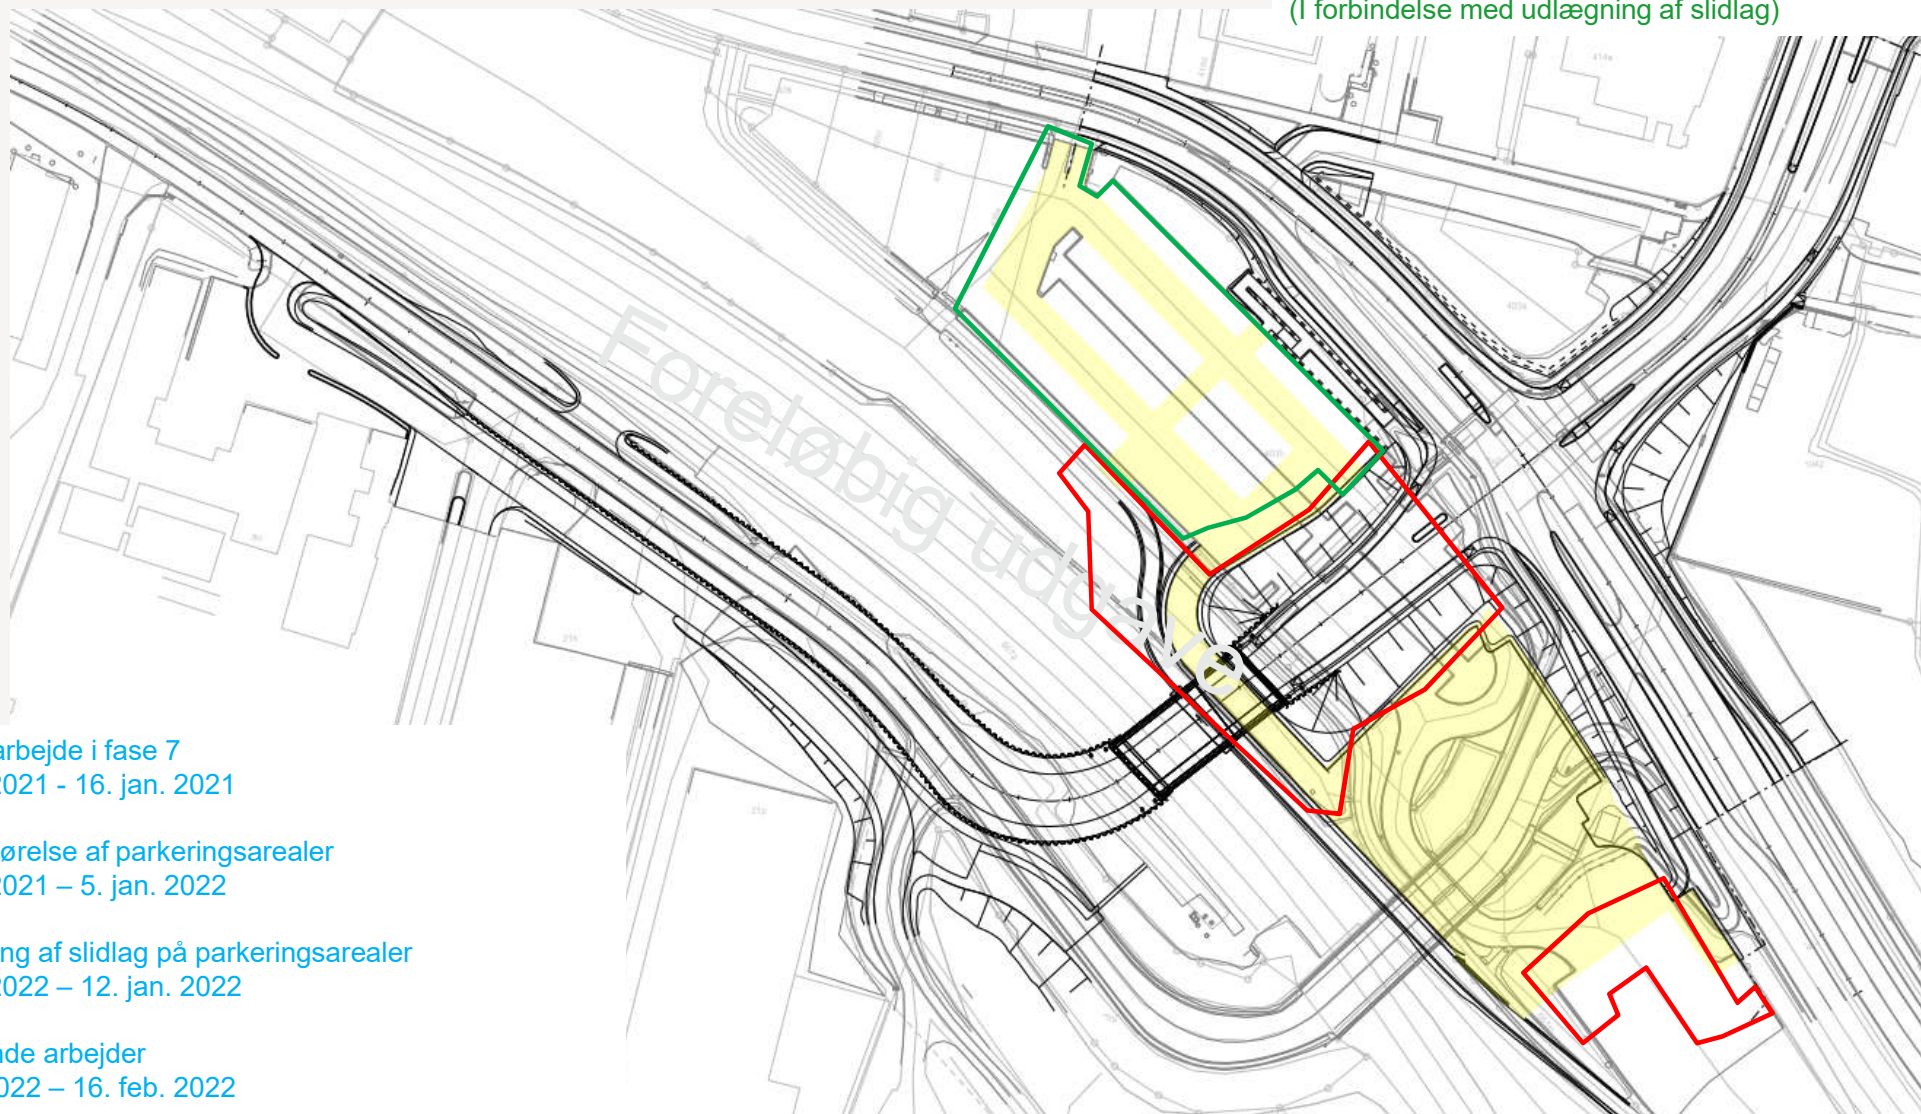

Anlægsarbejde i fase 7
9. dec. 2021 - 16. jan. 2021

Færdiggørelse af parkeringsarealer
9. dec. 2021 – 5. jan. 2022

Udlægning af slidlag på parkeringsarealer
6. Jan. 2022 – 12. jan. 2022

Afsluttende arbejder
6. jan. 2022 – 16. feb. 2022
