



Dialogmøde i Glumsø

Ringsted-Femern Banen

16.08.2018



Co-financed by the European Union
Trans-European Transport Network (TEN-T)

bandedanmark



Dialogmøde

Dagsorden

- Status/Siden sidst på programmet, v. Klaus
- Spærringer af banen v. Klaus
- Glumsø Station v. Lars
- Fremsendte spørgsmål
- Evt.
- Næste møde

Status siden sidst (08.03.2018)

Forårets/sommerens arbejder

- Sporspærring på Falster og Lolland forløbet efter planen
- Kurveforlægning ved Eskilstrup (Falster) færdig
- Ny station i Eskilstrup åbnet
- Støjskærme opsat i Eskilstrup
- Jordarbejder ifm dobbeltspor på Falster
- Arbejde på mange broer (25 "aktive" + 5 broer med restarbejder)
- Masnedsundbroen – landanlæg og ny bro på plads

Afslutning af lang sporspærring i 2018

Indvielse af Eskilstrup Station



Ny station i Eskilstrup



Jordarbejder for dobbeltspor på Falster



Broer på Lolland

Nystedvej



Masned Sundbroen - montage af brodrager 5 29.07.2018





Glumsøkurven



Glumsøkurven

Møllebækvej



Østerskov



Kommende arbejder

Arbejder i efteråret

- Glumsøkurven
- Rampen i Næstved + øvrige broer
- Støjskærme i Næstved
- Kurveforlægning ved Ring
- Besigtigelsesforretning i Glumsø By

Rampen i Næstved

11.04.2018



Sporspærringer




	2018		2019		2020		2021	
	Start	Slut	Start	Slut	Start	Slut	Start	Slut
Rg-Næ totalsp.					28.3.20 Stage 20	30.8.20 Stage 21		
Næ-Vo totalsp.			30.3.19 Stage 34	11.8.19 Stage 44				
Vo-Oh totalsp.			30.3.19 Stage 9a	11.8.19 Stage 18				
Oh-Nf totalsp.	24.3.18 Stage 12	3.6.18 Stage 24	30.3.19 Stage 28	15.9.19 Stage 32			8.5.21 Stage 37	26.9.21 Stage 42
Nf-Nfv totalsp.							8.5.21 Stage 20	26.9.21 Stage 26
Nfv-Rf totalsp.	24.3.18 Stage 12	10.6.18 Stage 15						

Planlagte vejlukninger

Glumsø og omegn

Vej	Planlagt lukning	Planlagt åbning
Tyvelsevej ✓	Marts 2017	Dec. 2017 (28.02.2018)
Møllebækvej	15. April 2018	Dec. 2018
Sandbyvej	Marts 2020	Maj 2020
Holmager	Marts 2020	Maj 2020
Ravnstrupvej N ✓	April 2017	Dec. 2017 (29.12.2017)

Glumsø Station

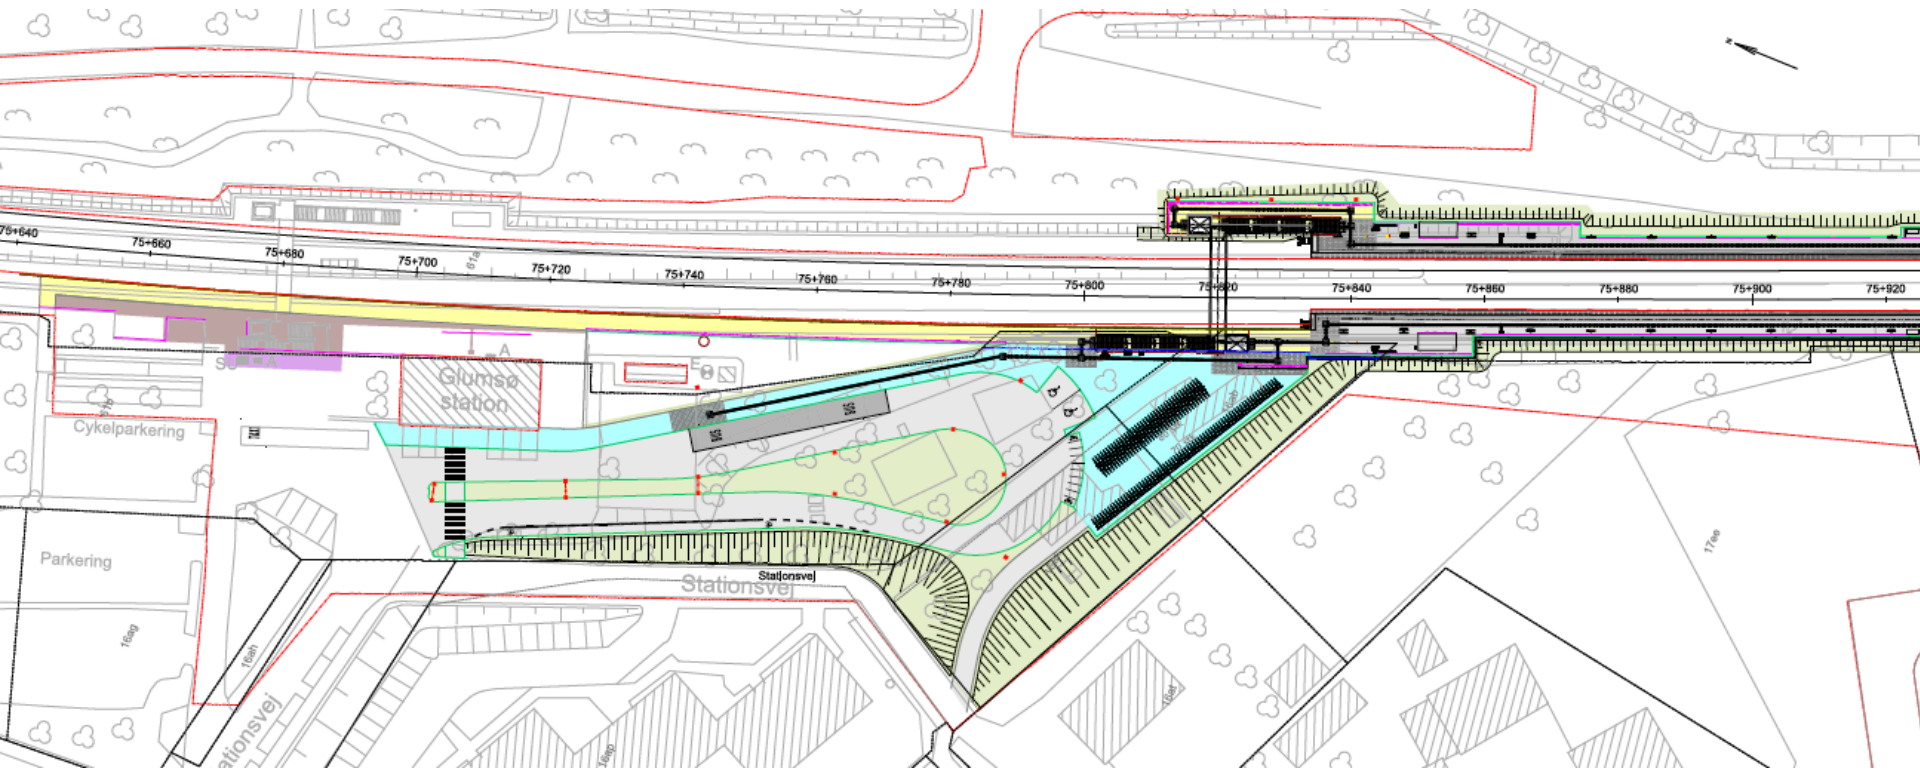

Fremsendte spørgsmål

- Stationen - hvorfor det tilsyneladende, flere år før den fysiske udførelse starter, blev så fastlåst.
- Stien til Østergade (Næstved Kommune)
- Skiltning - under arbejdet og sluttelig permanent skiltning.
- Støjafskærmning - beplantning med Efeu hvordan i praksis.
- Status på igangværende broprojekter (Tyvelsevejbroen skulle have været færdiggjort og overdraget til Næstved Kommune i juni måned og hvordan forløber det med broen på Møllebækvej).
- Kommunikation til interessenter (Hverken Dialoggruppen, Lokalrådet eller andre interessenter er blevet orienteret, når der er sket (væsentlige) ændringer i projekterne.
- Har RFB et Co2 regnskab, nu hvor vi kører så meget rundt med lastbiler, jord osv.?



Eventuelt og næste møde
