



Netredegørelsen 2022 – Bilag 3.5A




Bilag 3.5A

Indhold	Side
1. Fjernbanen	
Oversigt over Fjernbanen	3 - 6
TIB 1 - 35	8 - 16
2. S-banen	
Oversigt over S-banen	7
TIB 810 - 880	17 - 18

Fjernbanen TIB 1-2

Netredefølrelsen 2022 - overblik 2022

- **København H - Høje Taastrup**
København – Høje Taastrup
- **Glostrup – Høje Taastrup**
Hastighedsopgradering
- **Ringsted – Roskilde**
Sporombygning
- **Slagelse – Korsør**
Spor og broarbejder
- **Nykøbing F. V - Rødby Færge**
Ringsted Femern
- **Orehoved**
Signalprogrammet
- **Snoghøj - Fredericia**
EP
- **Snoghøj - Taulov**
EP

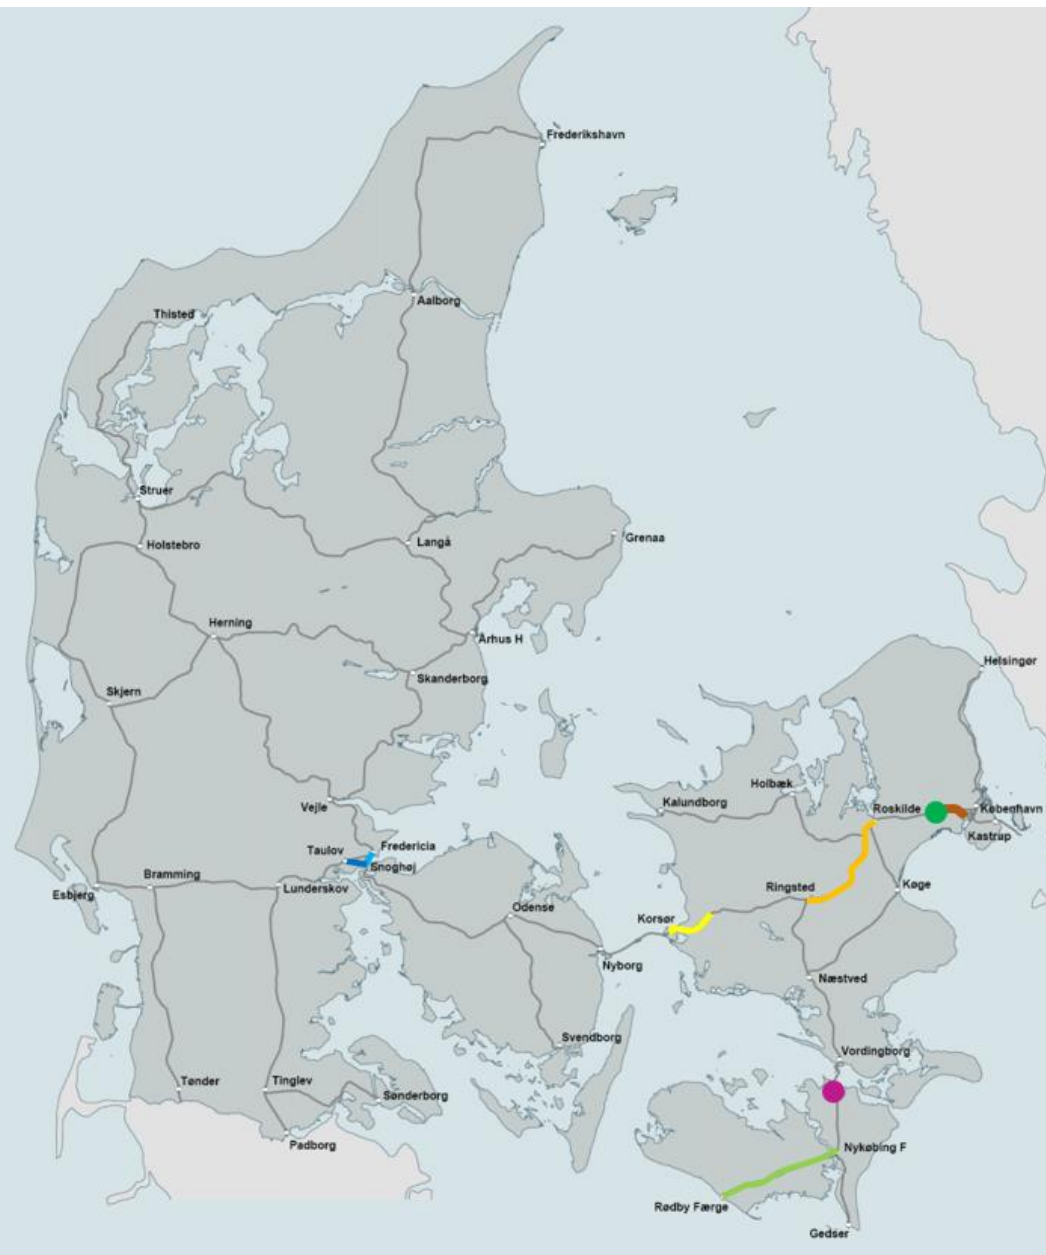

Fjernbanen TIB 4-11

Netredefølrelsen 2022 - overblik 2022

- **Køge N - Næstved**
Perronforlængelse på Haslev St.
- **Roskilde – Lejre**
Sporombygning
- **Holbæk – Kalundborg** flere strækninger TIB 5
Roskilde-Kalundborg
- **Vigerslev – Ringsted**
Signalprogrammet
- **Københavns Lufthavn Kastrup - Peberholmen**
Broarbejder Øresundsbroen
- **Kastrup**
Ny Kastrup Lufthavn Station



Fjernbanen TIB 21-25

Netredefølrelsen 2022 - overblik 2022

- **Odense – Svendborg**
Signalprogrammet
- **Fredericia**
Elevator
- **Fredericia – Børkop - Vejle**
Forberedende arbejder EP
- **Vejle – Hedensted**
Forberedende arbejder EP
- **Horsens – Aarhus**
Forberedende arbejder EP
- **Skanderborg – Hørning**
Stilling St.
- **Aarhus – Langå**
Sporombygning og hastighedsopgradering
- **Hobro – Aalborg**
Broarbejde + forberedende arbejder EP
- **Aalborg – Lindholm**
Vesterbro reovering



Fjernbanen TIB 31-35

Netredegørelsen 2022 - overblik 2022


- Struer St.**
Vinderup – Struer
Hvidbjerg – Struer
Hjerm – Struer
Sporfornyelse og trimning af sporskifter + Oddesundbroen
- Holstebro – Struer**
Broarbejde + Signalprogram Vest
- Struer – Vemb**
Signalprogram Vest
- Ulfborg – (Holstebro)**
Signalprogram Vest
- Holstebro – Vejle**
Signalprogram Vest
- Struer – Thisted**
Ledelinjer
- Hammerum – Svejbæk**
Signalprogram Vest
- Engesvang – Skanderborg**
Signalprogram Vest
- Borris – Bording**
Signalprogram Vest



S-banen

Netredefølrelsen 2022 - overblik 2022

- **Glostrup – Høje Taastrup**
København-Høje Taastrup + Hovedstadens Letbane
 - **Østerport - Lyngby**
Køreledningsudskiftning
 - **Nørrebro - Lersøen**
Nordvestpassagen, fodgængerbro
 - **Herlev - Ballerup**
Etablering af Letbanekrydsning
- Flere hele TIB strækninger (ikke markeret)
Signalprogrammet

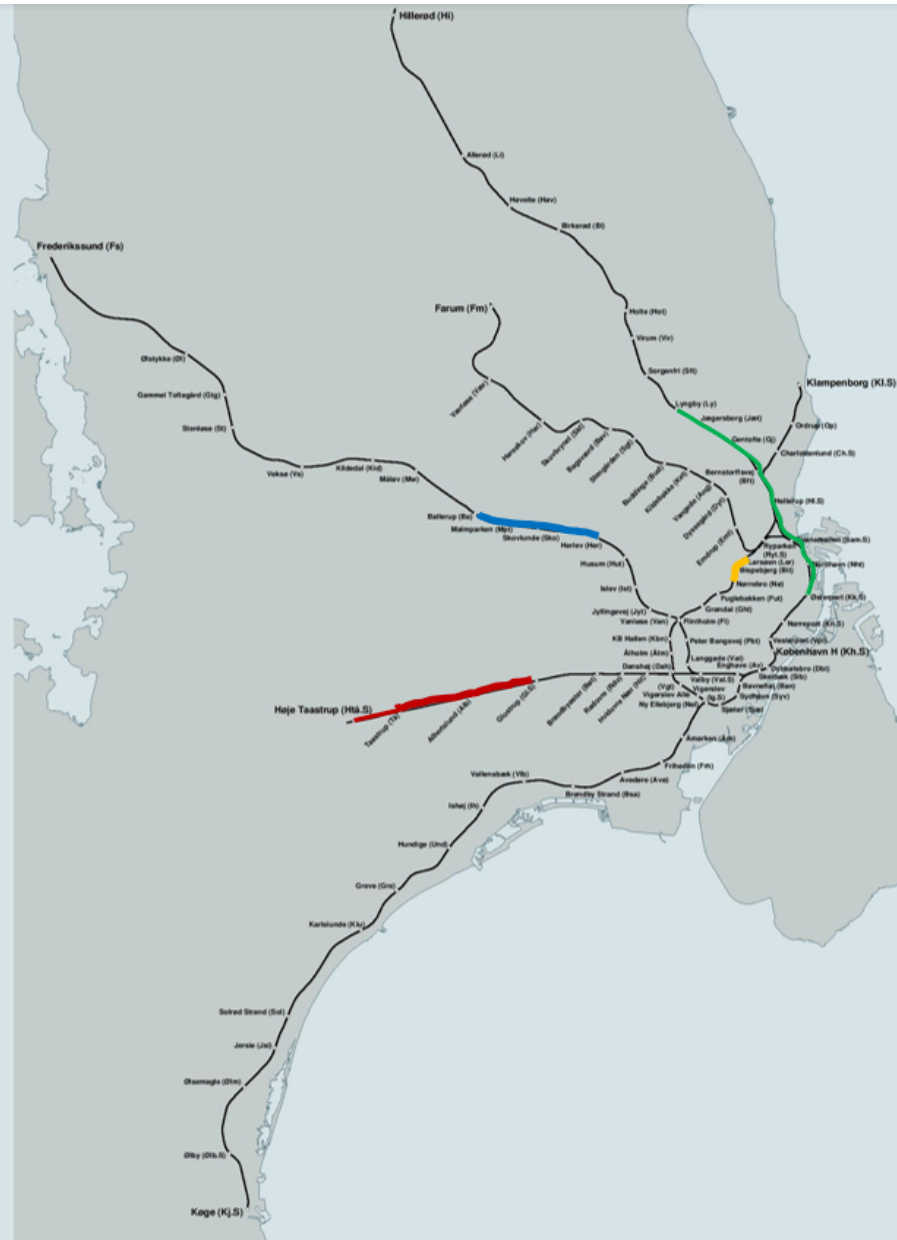

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
1	1	København H (ekskl.) – Høje Tåstrup (inkl.)	Sporfornyelse Kh-Htå	Spor, sporskifter og afvandingsarbejder	18 døgn	Juli-august	6/7-25/7	Totalspærring Det er muligt at køre til Høje Tåstrup fra vest.	Banedanmark	High
2	1	Glostrup (ekskl.) – Høje Tåstrup (ekskl.)	Sporfornyelse Kh-Htå	Spor og afvandingsarbejder	7 uger	Maj-juli	2/5-25/6	Højre spor spærret	Banedanmark	Major
3	1	Høje Tåstrup (inkl.) – Glostrup (ekskl.)	Sporfornyelse Kh-Htå	Spor og afvandingsarbejder	7 uger	August-september	8/8-2/10	Højre spor spærret	Banedanmark	Major
4	1	Glostrup (inkl.) – Høje Tåstrup (ekskl.)	Hovedstadens letbane v. Glostrup	Broindhejsning	1 weekend	Påske	15-18.april	Alle spor spærret. Ingen drift Kh – Htå	Hovedstadens Letbane (3. part)	Medium
5	1	Ringsted (ekskl.) – Roskilde (ekskl.)	Sporombygning	Spor og broarbejder		Alle forårets helligdags-weekender	9/4 – 18/4 13/5 -15/5 26/5 – 29/5 4/6 – 6/6	Enkeltsporsspærring . Der spærres ét spor ad gangen på strækningen Ro-Rg.	Banedanmark	Medium
6	1	Ringsted (ekskl.) – Roskilde (ekskl.)	Sporombygning	Spor og broarbejder	3 uger	Juli-august	17/7 -7/8	3 uger totalspærring	Banedanmark	High
7	1	Ringsted (ekskl.) – Roskilde (ekskl.)	Sporombygning	Spor og broarbejder	9 uger	Juli-september	5/7 - 16/7 8/8 - 2/10	11 uger enkeltsporsspærring . Der spærres ét spor ad gangen på strækningen Ro-Rg.	Banedanmark	High
8	1	Slagelse (ekskl.) – Korsør (ekskl.)	NFSP0541	Spor og broarbejder Slagelse - Korsør		Alle forårets helligdags-weekender	9/4 – 10/4 14/4 -18/4 13/5 -15/5 26/5 – 29/5 4/6 – 6/6	Enkeltsporsspærring . Der spærres ét spor ad gangen på strækningen Sg-Kø.	Banedanmark	Medium
9	1	Slagelse (ekskl.) – Korsør (ekskl.)	NFSP0541	Spor og broarbejder Slagelse - Korsør	3 uger	Juni-juli	27/6 – 17/7	Enkeltsporsspærring er. Der spærres ét spor ad gangen på strækningen Sg-Kø. Dele af spor 1 i Korsør er spærret.	Banedanmark	High
10	1	Slagelse (ekskl.) – Korsør (inkl.)	NFSP0541	Spor og broarbejder Slagelse - Korsør	8 dage + 8 timer	Juli	17/7 – 25/7	Totalspærring. Det er muligt at køre til Korsør fra vest.	Banedanmark	High
11	1	Slagelse (ekskl.) – Korsør (ekskl.)	NFSP0541	Spor og broarbejder Slagelse - Korsør	2 uger	Juli-august	25/7 – 7/8	Enkeltsporsspærring er. Der spærres ét spor ad gangen på strækningen Sg-Kø.	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
								Dele af spor 1 i Korsør er spærret. 12		
12	1	Snoghøj (inkl.) – Fredericia (inkl.)	EP Modernisering NA0022	Etablering af ny neutralsektion	1x 30 timer pr. spor	Q1-Q2	Ikke fastlagt	Enkeltsporstrid + KA	Banedanmark	Medium
13	1	Snoghøj (inkl.) – Taulov (inkl.)	EP Modernisering NA0022	Etablering af ny neutralsektion	1x 30 timer pr. spor	Q1-Q2 2022	Ikke fastlagt	Enkeltsporstrid + KA	Banedanmark	Medium
14	2	Orehoved (inkl.)	Signalprogrammet Fjernbane Rollout 7	Test / Ibrugtagning af spor 1	2 x 56 timer	Q1, Q2	Ikke fastlagt	Totalspærring	Banedanmark	Medium
15	2	Nykøbing F Vest (ekskl.) – Rødby Færge (inkl.)	RFB	Blødbundsarbejder, forberedelser til dobbeltspor	Hele året	Hele året	1/1-31/12	Totalspærring	Banedanmark	Major
16	2	Nykøbing F Vest (inkl.), spor 1 (I-signal D til U-signal B)	RFB	Placering af materiel mm. Rangering til og fra arbejdsområdet	Hele året	Hele året	1/1-31/12	Totalspærring. Lokaltog kan køre til Nykøbing F St.	Banedanmark	Major
17	4	Køge N (ekskl.) - Næstved (ekskl.)	Perronforlængelse på Haslev st.	Sporskifte arbejder inden perronforlængelse af ø-perron	8 dage	Forår	10/4-18/4	Totalspærring	Banedanmark	High
18	4	Køge N (ekskl.)- Næstved (ekskl.)	Perronforlængelse på Haslev st.	Opsætning af 18 meter ekstra perron i sydlig retning. I Forlængelse af ø-perron	4 uger	Sommer	2/7-31/7	Spærring af spor 2 / ø-perron. Spor 1 vil være kørbart.	Banedanmark	High
19	5	Roskilde (ekskl.) - Lejre (ekskl.)	Sporombygning Roskilde - Ringsted	Drænararbejde, sporkasse	3 weekender	Juli – august	17/7 – 7/8	Enkeltsporsspærring	Banedanmark	Medium
20	5	Holbæk (ekskl.) - Kalundborg (Inkl.)	Roskilde - Kalundborg	Sporarbejder	4 uger	April-maj	08/4-06/5	Totalspærring	Banedanmark	Major
21	5	Jyderup (ekskl.)- Kalundborg (ekskl.)	Sporarbejder	Sporarbejder i Jy – Se, i Væ, og i Kb	16 dage	Marts-november	1/3-1/11	Totalspærring	Banedanmark	High
22	6	Vigerslev (ekskl.)- Kjn -Ringsted (ekskl.)	Signalprogrammet Fjernbane Rollout 1	Statisk test	2 x 56 timer	Q1	Endnu ikke fastlagt	Totalspærring	Banedanmark	Medium
23	6	Vigerslev (ekskl.)- Kjn-Ringsted (ekskl.)	Signalprogrammet Fjernbane Rollout 1	Statisk test	3 x 56 timer	Q2	Endnu ikke fastlagt	Totalspærring	Banedanmark	Medium
24	6	Vigerslev (ekskl.) – Kjn – Ringsted (ekskl.)	Signalprogrammet Fjernbane Rollout 1	Afprøvningskørsler	6 x 56 timer	Q3, Q4	Endnu ikke fastlagt	Totalspærring	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
		København G (ekskl.) – Kjn – Ringsted (ekskl.) Lille Skensved (ekskl.) – Kjn (ekskl.)								
25	6	Vigerslev (ekskl.) – Kjn-Ringsted (ekskl.)	Signalprogrammet Fjernbane Rollout 1	Ibrugtagning	1 x 56 timer	Q4	Endnu ikke fastlagt	Totalspærring	Banedanmark	Medium
26	11	Københavns Lufthavn Kastrup (ekskl.) – Peberholm (inkl.)	Vedligehold	Vedligehold af Øresundsbroen	24 timer	Marts	19/3 – 20/3	Totalspærring	Øresundsbroen	Medium
27	11	Københavns Lufthavn Kastrup (ekskl.) – Peberholm (inkl.)	Vedligehold	Vedligehold af Øresundsbroen	24 timer	November	5/11 – 6/11	Totalspærring	Øresundsbroen	Medium
28	11	Kastrup station (inkl.)	Ny Kastrup Lufthavn Station (NKLS)	Stadie 1a: Køreledningsarbejder, bl.a. Indbygning af ny kobler	9 døgn	Juli	16/07 – 25/07	Spærring af spor 11+12, alle tog via spor 1+2 og SORF fra 2.Hsp Phm-Cph	Sund og Bælt	High
29	21	Odense (ekskl.) – Svendborg (inkl.)	Signalprogrammet Fjernbane Rollout 10	Afprøvningskørsler	7 x 56 timer	Q1, Q2	Endnu ikke fastlagt	Totalspærring	Banedanmark	Medium
30	21	Odense (ekskl.) – Svendborg (inkl.)	Signalprogrammet Fjernbane Rollout 10	Afprøvningskørsler	5 x 56 timer	Q3	Endnu ikke fastlagt	Totalspærring	Banedanmark	Medium
31	23	Fredericia (inkl.) – Fredericia (inkl.)	Elevator NPTG0016	Etablering af elevator i spor 2	23 døgn	Marts-september	Uge 22 – 25	Spor 2 og 3 spærret	Banedanmark	High
32	23	Fredericia (inkl.) – Børkop (inkl.) – Vejle (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, nyt sted Bro 20520.8	7 x Weekendspærring	1., 2. og 3. kvartal 2022	Uge: 3,14,17,18,19,20,35	Enkeltsporsdrift Fredericia – Børkop - Vejle	Banedanmark	Medium
33	23	Fredericia (inkl.) – Børkop (inkl.) – Vejle (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, nyt sted Bro 20520.8	LA40	Januar-februar	3 uger 16/1-7/2	La 40 max 300 meter ud or bro 20520.8 i begge hovedspor	Banedanmark	High
34	23	Børkop (ekskl.) – Vejle (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Brohævning Bro 20568	1 sporspærring (34 timer)	1. kvartal 2022	11/2-13/2	Spærring af spor 2, 4 og 40, venstrespor Vj-Bk, udrangering Vj	Banedanmark	Medium
35	23	Børkop (ekskl.) – Vejle (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Brohævning Bro 20568	1 sporspærring (22 timer)	1. kvartal 2022	13/2-14/2	Spærring af spor 4, 6 og 40, venstrespor	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser Bk-BVj, indrangering Vj	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
36	23	Vejle (inkl.) - Hedensted (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, nyt sted Bro 20621	1 x døgnspærring (30 timer)	Februar	26/2-27/2	Totalspærring begge spor Vejle – Hedensted	Banedanmark	Medium
37	23	Vejle (inkl.)- Hedensted (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, nyt sted Bro 20621	1 x døgnspærring (30 timer)	November	19/11-20/11	Totalspærring begge spor Vejle – Hedensted	Banedanmark	Medium
38	23	Vejle (inkl.)- Hedensted (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, nyt sted Bro 20621	LA40	Løbende	Samtidig med spærringer	Begge spor Vejle- Hedensted	Banedanmark	*
39	23	Vejle (inkl.)- Hedensted (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Nedlæggelse af bro Bro 20624	1 x døgnspærring (30 timer)	April	22/4-24/4	Totalspærring begge spor Vejle – Hedensted	Banedanmark	Medium
40	23	Horsens (inkl.) - Hovedgård (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, samme sted Bro 20724	1 x weekendspærring	Maj	20/5-22/5	Totalspærring begge spor mellem Horsens-Hovedgaard	Banedanmark	Medium
41	23	Horsens (inkl.)- Hovedgård (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, samme sted Bro 20724	LA40	Løbende	Samtidig med spærringer	Begge spor mellem Horsens-Hovedgaard	Banedanmark	*
42	23	Hovedgård (inkl.) - Skanderborg (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, samme sted Bro 20756	1 x døgnspærring (30 timer)	April	23/4-24/4	Totalspærring begge spor mellem Hovedgaard-Skanderborg	Banedanmark	Medium
43	23	Hovedgård (inkl.) - Skanderborg (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Brohævning Bro 20764	1 x weekendspærringer	Juni	10/6-12/6	Totalspærring begge spor mellem Hovedgaard-Skanderborg	Banedanmark	Medium
44	23	Hovedgård (inkl.) - Skanderborg (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Brohævning Bro 20764	10 x døgnspærringer	Juli	4/7-13/7	Venstresporskørsel Skanderborg – Hovedgaard	Banedanmark	High
45	23	Hovedgård (inkl.) - Skanderborg (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Brohævning Bro 20764	1 x weekendspærring	Juli	15/7-17/7	Venstresporskørsel Hovedgaard – Skanderborg	Banedanmark	Medium
46	23	Hovedgård (inkl.) - Skanderborg (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Brohævning Bro 20764	1 x weekendspærring	August	12/8-14/8	Totalspærring begge spor mellem Hovedgaard-Skanderborg	Banedanmark	Medium
47	23	Hovedgård (inkl.) - Skanderborg (inkl.)	Forberedende arbejder Fa-AR	Ny bro, samme sted Bro 20772	1 x weekendspærring	Maj	13/5-15/5	Totalspærring begge spor mellem Hovedgaard-Skanderborg	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
48	23	Hovedgård (inkl.) - Skanderborg (inkl.)	Forberedende arbejder Fa-Ar	Ny bro, samme sted Bro 20772	1 x weekendspærring	Maj	20/5-22/5	Totalspærring begge spor mellem Hovedgaard-Skanderborg	Banedanmark	Medium
49	23	Hovedgård (inkl.) - Skanderborg (inkl.)	Forberedende arbejder Fa-Ar	Ny bro, samme sted Bro 20772	LA40	Maj	10/5 - 30/5	La 40 max 300 meter ud or bro 20772 begge hovedspor	Banedanmark	*
50	23	Hovedgård (inkl.) - Skanderborg (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, nyt sted Bro 20789	1 x weekendspærring	December	2/12 - 4/12	Totalspærring begge spor mellem Hovedgaard-Skanderborg	Banedanmark	Medium
51	23	Skanderborg (inkl.) - Hørning (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny gangbro, samme sted - Bro 20808	1 x weekendspærring	Marts	11/3-13/3	Totalspærring begge spor mellem Skanderborg - Hørning	Banedanmark	Medium
52	23	Skanderborg (inkl.) - Hørning (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny gangbro, samme sted - Bro 20808	1 x weekendspærring	Maj	20/5-22/5	Totalspærring begge spor mellem Skanderborg - Hørning	Banedanmark	Medium
53	23	Skanderborg (inkl.) - Hørning (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny gangbro, samme sted - Bro 20808	LA40	Marts, april og maj	8/3-10/4 + 17/5-30/5	La 40 max 300 meter ud or bro 20808 begge hovedspor	Banedanmark	*
54	23	Skanderborg (inkl.) - Hørning (inkl.)	Forberedende arbejder Fa-Ar	Ny bro, samme sted Bro 20812	1 x weekendspærring	Marts	25/3-27/3	Totalspærring begge spor mellem Skanderborg - Hørning	Banedanmark	Medium
55	23	Skanderborg (inkl.) - Hørning (inkl.)	Forberedende arbejder Fa-Ar	Ny bro, samme sted Bro 20812	1 x weekendspærring	April	1/4-3/4	Totalspærring begge spor mellem Skanderborg - Hørning)	Banedanmark	Medium
56	23	Skanderborg (ekskl.) - Hørning (ekskl.)	Genåbning af Stilling st. - Trinbræt	Ombygning af venstre spor	5 dage	Påske	11/4 - 15/4	Enkelt sporspærring - LA40 i højre spor	Banedanmark	Medium
57	23	Skanderborg (ekskl.) - Hørning (ekskl.)	Genåbning af Stilling st. - Trinbræt	Indbygning af perron element, venstre spor	2 dage	Påske	15/4 - 17/4	Enkelt sporspærring - LA40 i højre spor	Banedanmark	Medium
58	23	Skanderborg (ekskl.) - Hørning (ekskl.)	Genåbning af Stilling st. - Trinbræt	Indbygning af perron element, højre spor	2 dage	St. bededag	13/5 - 15/5	Enkelt sporspærring - LA40 i venstre spor	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
59	23	Skanderborg (inkl.) - Aarhus (inkl.)	Forberedende arbejder Fa-AR	Ny bro, samme sted Bro 20813.8	1 x weekendspærring	April-maj	29/4-1/5	Totalspærring alle spor	Banedanmark	Medium
60	23	Hørning (inkl.) - Aarhus (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, samme sted Bro 20828	1 x weekendspærring	April	15/4-17/4	Totalspærring begge spor mellem HX-AR	Banedanmark	Medium
61	23	Hørning (inkl.) - Aarhus (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, samme sted Bro 20828	1 x weekendspærring	April	22/4-24/4	Totalspærring begge spor mellem HX-AR	Banedanmark	Medium
62	23	Hørning (inkl.) - Aarhus (inkl.)	Forberedende arbejder FA-AR	Ny bro, samme sted Bro 20828	LA40	Marts-Maj	27/3-1/5	La 40 max 300 meter ud or bro 20828 begge hovedspor	Banedanmark	*
63	24	Aarhus (inkl.) - Langå (inkl.)	Sporombygning og hastighesopradering Ar-Lg Nfsp0503/Na0052	Bro- og afvandingsarbejde. Sporombygning.	56 timer	April	1 /4-4/4	Totalspærring	Banedanmark	Medium
64	24	Aarhus (inkl.) - Langå (inkl.)	Sporombygning og hastighesopradering Ar-Lg Nfsp0503/Na0052	Ombygning af Br-station. Bro- og afvandingsarbejder. Diverse 3. parts projekter.	10 døgn	April	8/4-19/4	Totalspærring	Banedanmark	High
65	24	Aarhus (inkl.) - Langå (inkl.)	Sporombygning og hastighesopradering Ar-Lg Nfsp0503/Na0052	Ballastrensning og sporombygning. Broarbejder og afvandning. Jordarbejder DSB værksted.	18 døgn	Maj-juni	20/5-7/6	Tootalspærring	Banedanmark	High
66	24	Aarhus (inkl.) - Langå (inkl.)	Sporombygning og hastighesopradering Ar-Lg Nfsp0503/Na0052	Ballastrensning	56 timer	August	19/8-22/8	Totalspærring	Banedanmark	Medium
67	24	Aarhus (inkl.) - Langå (inkl.)	NA00443	Forberedende arbejder for elektrificering	56 timer	Februar	17/2-20/2	Totalspærring	Banedanmak	Medium
68	24	Langå (inkl.) - Hadsten (inkl.)	Sporombygning og hastighesopradering Ar-Lg Nfsp0503/Na0052	Ballastrensning og sporombygning. Overkørselsarbejder	26 døgn	Juni-juli	17/6-13/7	Venstresporskørsel Lg-Ha	Banedanmark	High
69	24	Hadsten (inkl.) - Langå (inkl.)	Sporombygning og hastighesopradering Ar-Lg Nfsp0503/Na0052	Ballastrensning og sporombygning	30 døgn	Juli-august	20/7-19/8	Venstresporskørsel Ha-Lg	Banedanmark	Major

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
70	24	Aarhus (inkl.)- Brabrand (inkl.)	Sporombygning og hastighesopradering Ar-Lg Nfsp0503/Na0052	Broarbejder Silkeborgvej	15 døgn	Maj	6/5-20/5	Venstresporskørsel Ar-Br	Banedanmark	High
71	24	Brabrand (inkl.)- Aarhus (inkl.)	Sporombygning og hastighesopradering Ar-Lg Nfsp0503/Na0052	Broarbejder Silkeborgvej	17 døgn	April-maj	19/4-5/5	Venstresporskørsel Br-Ar	Banedanmark	High
72	24	Mundelstrup (inkl.)- Brabrand (inkl.)	Sporombygning og hastighesopradering Ar-Lg Nfsp0503/Na0052	Ballastrensning og sporombygning.	10 døgn	Juni	7/6-17/6	Venstresporskørsel Mu-Br	Banedanmark	High
73	24	Brabrand (inkl.) - Mundelstrup (inkl.)	Sporombygning og hastighesopradering Ar-Lg Nfsp0503/Na0052	Ballastrensning og sporombygning	22 døgn	Juni-juli	28/6-20/7	Venstresporskørsel Br-Mu	Banedanmark	High
74	24	Hadsten (inkl.) - Hinnerup (inkl.)	Sporombygning og hastighesopradering Ar-Lg Nfsp0503/Na0052	Ballastrensning og sporombygning. Overkørselsarbejder	17 døgn	Juni	11/6-28/6	Venstresporskørsel Ha-Hn	Bandenamrk	High
75	24	Hadsten (ekskl.) - Hinnerup (ekskl.)	Sporombygning og hastighesopradering Ar-Lg Nfsp0503/Na0052	Sporombygning	3 ½ døgn	April	4/4 - 8/4	Venstresporskørsel Ha-Hn	Banedanmark	Medium
76	24	Hinnerup (inkl.) - Hadsten (inkl.)	Sporombygning og hastighesopradering Ar-Lg Nfsp0503/Na0052	Ballastrensning og sporombygning	18 døgn	Juli	13/7-31/7	Venstresporskørsel Hn-Ha	Banedanmark	High
77	24	Mundelstrup (inkl.) -Hinnerup (inkl.)	Sporombygning og hastighesopradering Ar-Lg Nfsp0503/Na0052	Ballastrensning	36 døgn	Juli-september	31/7-19/8 samt 22/8-7/9	Venstresporskørsel Mu-Hn	Banedanmark	Major
78	24	Hinnerup (inkl.) - Mundelstrup (inkl.)	Sporombygning og hastighesopradering Ar-Lg Nfsp0503/Na0052	Ballastrensning	18 døgn	September	7/9-26/9	Venstresporskørsel Hn-Mu	Banedanmark	High
79	24	Hobro (inkl.) - Aalborg (inkl.)	Na00443	Broarbejde	1,5 døgn	Juni	20/6-22/6	Totalspærring Hobro - Skørping	Banedanmark	Medium
80	24	Skørping (inkl.) - Aalborg (inkl.)	Na00443	Broarbejde	4,5 døgn	Juni	3/6-7/6	Totalspærring Skørping - Aalborg	Banedanmark	Medium
81	24	Skørping (inkl.) - Aalborg (inkl.)	Na00443	Broarbejde	Weekend	August	12/8-15/8	Totalspærring Hobro - Skørping	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
82	24	Skørping (ekskl.) – Aalborg (ekskl.)	Forb. Arbejde Ep	Bro arbejde	56 timer	2 kvartal	08/4-11/4	Alle tog aflyst i begge retninger	Bdk	Medium
83	24	Skørping (ekskl.) – Aalborg (ekskl.)	Forb. Arbejde Ep	Bro arbejde	5 døgn + 1 nat	2 kvartal	13/4-19/4	Alle tog aflyst i begge retninger	Bdk	Medium
84	24	Skørping (ekskl.) – Aalborg (ekskl.)	Forb. Arbejde Ep	Bro arbejde	20 dage	2 kvartal	19/4-09/5	La 40 over 200 meter ud fro bro 21148	Bdk	*
85	25	Aalborg (inkl.) – Lindholm (ekskl.)	3 parts	Vesterbro renovering	5 døgn + en nat	2 kvartal	13/4-19/4	Alle tog delaflyses Aalborg – Lindholm	Aalborg kommune	Medium
86	25	Aalborg (inkl.) – Lindholm (ekskl.)	3 parts	Vesterbro renovering	3 døgn + en nat	2 kvartal	03/6-07/6	Alle tog delaflyses Aalborg – Lindholm	Aalborg kommune	Medium
87	31	Struer (ekskl.) – Vemb (ekskl.)	Signalprogram Vest	Implementering	3 døgn + en nat	2 kvartal	12/5-16/5	Alle spor er spærret	Banedanmark	Medium
88	31	Vemb (ekskl.) - Hjern (ekskl.)	Signalprogram Vest	Implementering	3 døgn + en nat	2 kvartal	03/6-07/6	Alle tog delaflyses	Banedanmark	Medium
89	31	Ulfborg (inkl.) - Holstebro (ekskl.)	Signalprogram Vest	Implementering	Weekend á 56 timer	December	9/12-12/12	Alle spor er spærret	Banedanmark	Medium
90	31	Holstebro (inkl.) – Struer (inkl.)	NFSP05001 Struer St	Broarbejde	3 uger + 1 dag	Juli-august	22/7-13/8	Totalspærring	Banedanmark	High
91	31	Hjern (inkl.) – Struer (inkl.)	NFSP05001 Struer St	Sporfornyelse og trimning af sporskifter	3 uger + 1 dag	Juli-august	22/7-13/8	Totalspærring	Banedanmark	High
92	32	Vinderup (inkl.) – Struer (inkl.)	NFSP05001 Struer St	Sporfornyelse og trimning af sporskifter	3 uger + 1 dag	Juli-august	22/7-13/8	Totalspærring	Banedanmark	High
93	33	Struer (ekskl.) – Holstebro (inkl.)	Signalprogram Vest	Implementering	3 døgn + en nat	2 kvartal	12/5-16/5	Tog kan vende i spor 1 Holstebro	Banedanmark	Medium
94	33	Herning (ekskl.) – Vejle (ekskl.)	Signalprogram Vest	Implementering	56 timer	3 kvartal	29/7-01/8	Alle tog delaflyses	Banedanmark	Medium
95	33	Aulum (Inkl.) – Holstebro (Inkl.)	Signalprogram Vest	Implementering	3 døgn + en nat	2 kvartal	03/6-07/6	Alle tog delaflyses	Banedanmark	Medium
96	33	Holstebro (ekskl.) – Herning (inkl.)	Signalprogram Vest	Implementering	56 timer	2 kvartal	17/6-20/6	Alle tog delaflyses + Hr tog kan vende i spor 3 og 4	Banedanmark	Medium
97	33	Vildbjerg (ekskl.) – Thyregod (ekskl.)	Signalprogram Vest	Implementering	56 timer	3 kvartal	08/7-11/7	Alle tog delaflyses	Banedanmark	Medium
98	33	Give (ekskl.) – Vejle (ekskl.)	Signalprogram Vest	Implementering	56 timer	3 kvartal	12/8-15/8	Alle tog delaflyses	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
99	33	Vejle (ekskl.) - Give (inkl.)	Signalprogram Vest	Implementering	Weekend á 56 timer	Maj	13/5- 16/5	Alle spor er spærret	Banedanmark	Medium
100	34	Struer (ekskl.) – Thisted (ekskl.)	Niveau fri overgang	Ledelinjer	14 uger	Maj – August	8/5-13/8	Totalspærring, i ly af Oddesundbroen	Banedanmark	Major
101	34	Struer St (inkl.)	NFSP05001 Struer St	Sporfornyelse og trimning af sporskifter	6 uger+1 dag	Juni-juli	9/6-22/7	Kun spor 4 og 5 til rådighed, ingen kørsel til mdt Struer	Banedanmark	Major
102	34	Struer (inkl.) – Hvidbjerg (inkl.)	NFSP05001 Struer St	Sporfornyelse og trimning af sporskifter	3 uger + 1 dag	Juli-august	22/7-13/8	Totalspærring	Banedanmark	High
103	34	Struer (ekskl.) – Hvidbjerg (inkl.)	NFSP05281 Oddesundbroen	Sporfornyelse på Oddesundbroen	14 uger	Maj – August	8/5-13/8	Totalspærring	Banedanmark	Major
104	35	Hammerum (ekskl.) – Svejlbæk (ekskl.)	Signalprogram Vest	Implementering	56 timer	3 kvartal	02/9-05/9	Alle tog delaflyses	Banedanmark	Medium
105	35	Engesvang (ekskl.) – Skanderborg (ekskl.)	Signalprogram Vest	Implementering	56 timer	3 kvartal	23/9-26/9	Alle tog delaflyses	Banedanmark	Medium
106	35	Borris (ekskl.) – Bording (ekskl.)	Signalprogram Vest	Implementering	56 timer	3 kvartal	08/7-11/7	Alle tog delaflyses	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
1	810	Glostrup (inkl.) – Tåstrup (ekskl.)	Hovedstadens letbane v. Glostrup	Broindhejsning	1 weekend	Påske	15-18.april	Begge spor GI-Tå spærret. Der kan vendes i GI fra Kh	Hovedstadens Letbane (3. part)	*
2	810	Taastrup spor 3 (inkl.)	Ombygning Kh – Htå (Fjern)	Dækningsspærringer for spærringer på fjern	4 dage	Juni	20/6 – 24/6	Enkeltspor drift Høje Taastrup – Taastrup – Glostrup	Banedanmark	*
3	810	Taastrup (ekskl.) – Glostrup (inkl.) + Glostrup spor 3 (inkl.)	Ombygning Kh – Htå (Fjern)	Dækningsspærringer for spærringer på fjern	5 uger	Maj-juni	1/5 – 9/6	Enkeltspor drift Tåstrup – Glostrup	Banedanmark	*
4	810	Høje Taastrup (ekskl.) – Taastrup (enkl.)	Ombygning Kh – Htå (Fjern)	Dækningsspærringer for spærringer på fjern	2 uger	Juni	9/6 – 24/6	Enkeltspor drift Høje Taastrup – Taastrup	Banedanmark	*
5	810	Høje Taastrup (inkl.) – Taastrup (inkl.) + Taastrup spor 3 (inkl.)	Ombygning Kh – Htå (Fjern)	Dækningsspærringer for spærringer på fjern	19 dage	Juli-august	16/7 – 3/8	Enkeltspor drift Høje Taastrup – Taastrup	Banedanmark	*
6	820	Hellerup sport 3, 4, 5 og 6	Køreledningsudskiftning Kk – Hot	Udskiftning af køreledning	6 døgn	April	13/4 – 19/4	Enkeltspor drift Sam – HI – Gj og Ler – HI – KI	Banedanmark	*
7	820	Hellerup spor 7 + 8	Køreledningsudskiftning Kk – Hot	Udskiftning af køreledning	2 x 56 timer	Sommer	Ikke fastlagt	Enkeltspor drift Gj – HI – Sam og KI – HI – Ler	Banedanmark	*
8	820	Gentofte spor1 +2	Køreledningsudskiftning Kk – Hot	Udskiftning af køreledning	56 timer	Sommer	Ikke fastlagt	Totalspærret Ly – HI	Banedanmark	*
9	820	Lyngby spor 1, 2 + 3	Køreledningsudskiftning Kk – Hot	Udskiftning af køreledning	80 timer	Maj	12/5 – 16/5	Totalspærret Gj – Vir	Banedanmark	*
10	820	Svanemøllen spor 3 +4	Køreledningsudskiftning Kk – Hot	Udskiftning af køreledning	2 x 56 timer	Sommer	Ikke fastlagt	Enkeltspor drift Kk – Sam – HI og Kk – Sam – Ryt	Banedanmark	*
11	820	Svanemøllen spor 5 +6	Køreledningsudskiftning Kk – Hot	Udskiftning af køreledning	2 x 56 timer	Sommer	Ikke fastlagt	Enkeltspor drift Ryt – Sam – Kk og HI – Sam – Kk	Banedanmark	*
12	820	Østerport spor 3 + 13	Køreledningsudskiftning Kk – Hot	Udskiftning af køreledning	2 x 56 timer	Ikke fastlagt	Ikke fastlagt	Enkeltspor drift Sam - Kk	Banedanmark	*
13	820	Østerport spor 3 + 13	Køreledningsudskiftning Kk – Hot	Udskiftning af køreledning	2 x 56 timer	Ikke fastlagt	Ikke fastlagt	Enkeltspor drift Kk - Kh	Banedanmark	*
14	820	Østerport spor 4 + 13	Køreledningsudskiftning Kk – Hot	Udskiftning af køreledning	2 x 56 timer	Ikke fastlagt	Ikke fastlagt	Enkeltspor drift Kh - Kk	Banedanmark	*
15	820	Østerport spor 4 + 13	Køreledningsudskiftning Kk – Hot	Udskiftning af køreledning	2 x 56 timer	Ikke fastlagt	Ikke fastlagt	Enkeltspor drift KK - Sam	Banedanmark	*

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
16	880	Nørrebro (inkl.) – Lersøen (inkl.)	Nordvestpassagen	Indskubning af stitunnel	10 døgn	Juli-august	22/7 – 1/8	Totalspærret NØ – Ler	Københavns Kommune	*
17	830	Herlev (inkl.) – Ballerup (ekskl.)	Etablering af Letbanekrydsning	Broarbejder	3 uger	Marts – april	Ikke fastlagt	Enkeltsporsdrift Ba - Her	Hovedstadens Letbane	*
18	830	Herlev (inkl.) – Ballerup (ekskl.)	Etablering af letbanekrydsning	Broarbejder	1 uge	Mindst 3 uger efter foregående spærring	Ikke fastlagt	Enkeltsporsdrift Ba - Her	Hovedstadens Letbane	*
19	810 820 850	*Svanemøllen (ekskl.) – Valby (ekskl.)/ Åmarken (ekskl.) *Østerport (inkl.) - Svanemøllen sp 5 (inkl.) * Københavns Hovedbanegård (inkl.) -Valby sp5 (inkl.) * Københavns Hovedbanegård (inkl.) -Åmarken sp 1 (inkl.)	Nyt signalsystem S-banen PSP: S/SB/BBFB-9-9-11160-SHBD	Ibrugtagning af ROC, S-bane signal projekt	1 weekend	Januar	15/1-17/1	Totalspærring	Banedanmark	*
20	810 830 850	*Københavns Hovedbanegård (inkl.) - Køge/Høje Taastrup/Frederikssund	Nyt signalsystem S-banen PSP: S/SB/BBFB-9-9-11160-SHBD	Operationel test ROS	1 weekend	Februar	19/2-21/2	Totalspærring	Banedanmark	*
21	810 830 850	* Københavns Hovedbanegård (inkl.) - Køge/Høje Taastrup/Frederikssund	Nyt signalsystem S-banen PSP: S/SB/BBFB-9-9-11160-SHBD	Ibrugtagning af ROS, S-bane signal projekt	1 weekend	September	24/9-26/9	Totalspærring	Banedanmark	*
